

ZMLUVA O DIELO Č. OBJEDNÁVATEĽA:

Č. ZHOTOVITEĽA : Z1/2022/076/15

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zaťková

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

Telefón: + 421 33 5531287

E-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo 581/B

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Zastúpený: Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.

Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa Závodu Bratislava v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Vladimír Kríž

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

Telefón: + 421 2 48271 534

E-mail: bratislava@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivu „Zmluvná strana“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 112 - 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s predmetom zákazky: „**Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky – Jánoštelek – Opatovský Sokolec, km 30,287 – 36,259**“ (ďalej len „dielo“ alebo „plnenie“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané práce a zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa Ponukových rozpočtov predložených Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania pre každý úsek cesty samostatne, ktoré tvoria Prílohu č. 2A a 2B tejto Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou, ako aj v zmysle projektovej dokumentácie z marca 2022 vypracovanej Ing. M. Hajdónym (zodpovedný projektant a autorský dozor je Ing. M. Zaťková), za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. Termíny vykonania diela sú stanovené v Harmonogramoch prác jednotlivých úsekov ciest, ktoré tvoria Prílohu č. 1A a 1B tejto Zmluvy a dojednané v Článku V. tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že vykonal obhliadku rekonštruovaných úsekov ciest a v plnom rozsahu sa zoznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe súťažné podklady a technicko- kvalitatívne podmienky (TKP) pre realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu prác a zhotoveniu diela potrebné.
5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 112 – 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je:
cesta II/561 Topoľníky – Jánoštelek, km 30,287 – 33,067 kumulatívneho staničenia cestnej databanky, okres Dunajská Streda
cesta II/561 Jánoštelek – Opatovský Sokolec, km 33,067 – 36,259 kumulatívneho staničenia cestnej databanky, okres Dunajská Streda

Článok III. Cena diela

1. Celková cena za dielo pozostáva z ceny za úsek cesty II/561 Topoľníky – Jánoštelek, km 30,287 – 33,067 a z ceny za úsek cesty II/561 Jánoštelek – Opatovský Sokolec, km 33,067 – 36,259. Je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:

Celková cena za dielo: 1 553 694,25 EUR (slovom: jedenmilión päťstopäťdesiatšesťtisíc šesťstodeväťdesiatštyri eur a 25/100) s DPH.

Cena bez DPH: 1 294 745,21 EUR

Sadzba DPH 20 %: 258 949,04 EUR

Cena za úsek II/561 Topoľníky – Jánoštelek, km 30,287 – 33,067:

776 228,52 EUR (slovom: sedemstosedemdesiatšesťtisíc dvestodvadsaťosem eur a 52/100) s DPH.

Cena bez DPH: 646 857,10 EUR

Sadzba DPH 20 %: 129 371,42 EUR

Cena za úsek II/561 Jánoštelek – Opatovský Sokolec, km 33,067 – 36,259:

777 465,73 EUR (slovom: sedemstosedemdesiatsedemtisíc štyristošesťdesiatpäť eur a 73/100) s DPH.

Cena bez DPH: 647 888,11 EUR

Sadzba DPH 20 %: 129 577,62 EUR

2. Cena diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukové rozpočty k jednotlivým úsekom cesty, ktoré tvoria Prílohu č. 2A a 2B tejto Zmluvy, predložil Zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazmi výmer a s projektovými dokumentáciami jednotlivých úsekov cesty. Cena diela podľa tohto Článku je konečná, a teda zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri realizácii diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačné geodetické zameranie pre oba úseky cesty samostatne oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme.
3. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie navyše prác v prípadoch:
 - a. vlastných chýb,
 - b. nepochopenia informácií uvedených v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch,
 - c. nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
 - d. nedostatočnej prípravy projektu.

Zhotoviteľ sa tiež nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto Zmluve.

Článok IV.

Zábezpeka

1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi ku dňu prevzatia staveniska podľa Článku V. tejto Zmluvy záruku – Performance bond (výkonnostnú záruku) pre každý úsek cesty samostatne na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto Zmluve, a to vo výške desať (10) % z ceny za príslušný úsek cesty bez DPH. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Performance bond (výkonnostnú záruku) formou prevodu finančných prostriedkov na účet Objednávateľa č. účtu alebo formou bankovej záruky, ktorá musí byť vystavená ku dňu prevzatia staveniska až do predloženia garančnej záruky – Warranty bond podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ nezloží záruku na účet Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - a. banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy v súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto Zmluve;
 - b. banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa;
 - c. banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená výzva Objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy, a Zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote Objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.
2. Performance bond (výkonnostná záruka) alebo jej nespotrebovaná časť bude Zhotoviteľovi vrátená alebo uvoľnená do 7 pracovných dní od predloženia garančnej záruky – Warranty bond v prípade, že Objednávateľovi nevznikol peňažný záväzok voči Zhotoviteľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy alebo si ho následne splnil.
3. Záruka – Performance bond slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa podľa zákona alebo majúcich pôvod v tejto Zmluve, s ktorými je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na krytie ktorých udelil

Zhotoviteľ súhlas v tejto Zmluve. Zhotoviteľ k použitiu záruky – Performance bond na tento účel udeľuje Objednávateľovi výslovný súhlas.

4. Záruku - Performance bond pre príslušný úsek cesty nahradí Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po odovzdaní príslušného úseku cesty Objednávateľovi podľa Článku V. tejto Zmluvy zárukou - Warranty bond (garančná záruka) vo výške päť (5) % z ceny za príslušný úsek cesty bez DPH, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy. Zhotoviteľ môže poskytnúť záruku – Warranty bond (garančná záruka) formou prevodu finančných prostriedkov na účet Objednávateľa č. účtu _____ alebo formou bankovej záruky. Nepredloženie záruky - Warranty bond (garančná záruka) zo strany Zhotoviteľa bude mať za následok neuhradenie faktúry Objednávateľom. V takomto prípade nie je Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny, pre ktoré by mohol od neho Zhotoviteľ žiadať úroky z omeškania. Záruka - Warranty bond nezanikne skôr ako uplynie záručná doba plynúca od podpísania preberacieho protokolu príslušného úseku cesty a v prípade predĺženia záručnej doby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jej trvanie po celú dobu trvania predĺženej záručnej doby. V prípade, že Zhotoviteľ nezloží záruku na účet Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - a. banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku Zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči Objednávateľovi na základe zákona alebo tejto Zmluvy;
 - b. banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu Objednávateľa;
 - c. banka poskytne Objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená výzva Objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list Objednávateľa adresovaný Zhotoviteľovi, v ktorom Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností Zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči Objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto Zmluvy, a Zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote Objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.
5. Warranty bond (garančná záruka) alebo jej nespotrebovaná časť bude vrátená alebo uvoľnená do 15 pracovných dní od doručenia výzvy Zhotoviteľa na vrátenie garančnej záruky alebo jej nespotrebovanej časti, najskôr však po uplynutí 5 rokov od podpísania preberacieho protokolu konkrétneho úseku cesty v prípade, že Objednávateľovi nevznikol peňažný záväzok voči Zhotoviteľovi podľa zákona alebo tejto Zmluvy.
6. Záruka – Warranty bond slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa podľa zákona alebo majúcich pôvod v tejto Zmluve, s ktorými je Zhotoviteľ v omeškaní alebo na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ súhlas v tejto Zmluve. Zhotoviteľ k použitiu záruky – Warranty bond na tento účel udeľuje Objednávateľovi výslovný súhlas.
7. V prípade použitia výkonnostnej alebo garančnej záruky Objednávateľom alebo zmeny ceny diela, od ktorej sa výška záruky odvíja, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť/doplniť záruku dojednanú v ods. 1 alebo ods. 4 tohto Článku Zmluvy do jej plnej výšky, a to najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie/doplnenie.

Článok V. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko pre vykonanie stavebných prác v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Výzva bude doručená samostatne pre každý úsek cesty.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi po jednotlivých úsekoch cesty v lehote do:
 - a. **69** dní odo dňa odovzdania staveniska pre vykonávanie stavebných prác na úseku cesty II/561 Topoľníky – Jánoštelek, km 30,287 – 33,067, vid'. Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1A tejto Zmluvy.

- b. **72** dní odo dňa odovzdania staveniska pre vykonávanie stavebných prác na úseku cesty II/561 Jánoštelek – Opatovský Sokolec, km 33,067 – 36,259, vid'. Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1B tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z týchto dôvodov:
- a) následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa,
 - b) pre objektívnu príčinu oneskorenia spôsobenú úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t. j. nie je primerane predvídateľná ku dňu uzavretia Zmluvy),
 - c) pre existenciu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle za sebou, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom,
 - d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti.
4. Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, spíše o tom Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí Zhotoviteľ spísať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 3 dni po tom, čo si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosti. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa je záznam v stavebnom denníku. O uznaní alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ Zhotoviteľovi písomné potvrdenie.
5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku potvrdený zástupcami oboch Zmluvných strán.
6. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 a viac pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5 tohto Článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy:

Za Objednávateľa: Ing. Monika Zaťková,
Ing. Róbert Lenče, _____
Angelika Borárosová, _____

Za Zhotoviteľa: stavbyvedúci: Ing. Peter Majerík,

V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho počas trvania zmluvného vzťahu, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania.

Článok VII.

Podmienky zhotovenia diela

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi staveniská s vymedzenými hranicami v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela (spoločne s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na realizáciu diela). O odovzdaní a prevzatí stavenísk spíšu Zmluvné strany protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania po celú dobu jej platnosti a účinnosti s požadovaným zmluvným poistným krytím minimálne vo výške ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení pre prípad poškodenia, zničenia diela alebo iných škôd na diele (stavebno-montážne

poistenie). Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny bez DPH za príslušný úsek cesty. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie rekonštrukcie príslušného úseku cesty.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
4. Zhotoviteľ je povinný v prípade zmien technických riešení oproti dokumentácii na realizáciu stavby (DRS) a na dopracovanie jednotlivých konštrukčných detailov vypracovať dokumentáciu vykonania prác (DVP) a predložiť ju Objednávateľovi a Autorskému dozoru na schválenie.
5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia stavenísk je zahrnuté v cene diela.
6. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
7. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.
8. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby ich Zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác ochráni. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú zahrnuté v cene diela.
9. Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách a v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácii a vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.
11. O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom prác a predloženým harmonogramom v trvaní 5 a viac pracovných dní, je Zhotoviteľ povinný predložiť upravený harmonogram najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ nebude upravený harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie. Ak Zhotoviteľ nepredloží upravený harmonogram ani po uplynutí určenej lehoty, Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa Článku XI. ods. 2 tejto Zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie diela a môžu mať vplyv na lehotu výstavby alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
13. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
14. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy.

15. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
16. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
17. Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.
18. Minimálne 14 dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov na stavbe zhrnie Zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach pri odovzdávaní diela Objednávateľovi po skončení realizácie stavebných prác.
19. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
21. Objednávateľ (alebo ním poverené osoby) má právo vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výroby, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť vstup poverenej osoby Objednávateľa alebo poverenej osoby akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek, ak bude Zhotoviteľovi dodávaná asfaltová zmes, betón, betonárska výstuž alebo oceľ zo strany subdodávateľa. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov, betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v:
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi účinných od 20.12.2019, vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
 - KLAZ 1/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí účinných od 20.12.2019 vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR,
 - súvisiacich STN a EN,
 - Katalógových listoch kameniva KLK 1/2012 účinnosť od 1.10.2012 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach – TKP 15 – Betónové konštrukcie všeobecne a TKP 18 – Betón na konštrukcie, účinnosť od 1.12.2018 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby SR,
 - Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 17 – Výstuž do betónu, účinnosť od 1.12.2013 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

- Technicko-kvalitatívnych podmienkach TKP 20 – Oceľové konštrukcie, účinnosť od 1.10.2014 vydané Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
22. Objednávateľ má právo prostredníctvom ním splnomocnených osôb vykonať v rekonštruovanom úseku cesty odvrtý, účelom ktorých je kontrola kvality diela (dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN (STN EN 12697-36:2005, STN EN 12697-1:2020 a STN EN 12697-2:2020). Odvrtý (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile vozovky na miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní diela. Kontrola kvality bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.
 23. V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou podľa predchádzajúcich odsekov 21 a 22, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 24. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele a kvality diela najneskôr do 3 pracovných dní po doručení protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zalatie nedostatočných spojov, atď. Dielo bude Objednávateľ považovať za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.
 25. Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
 26. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
 27. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.
 28. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
 29. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
 30. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
 31. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti, na svoje náklady. Zároveň zodpovedá za správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

32. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto určené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebiteľný a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015Z.z.
33. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.
34. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je Zhotoviteľ v omeškaní.
35. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.
36. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi ich presný termín.
37. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.
38. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením.
39. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
40. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím odovzdávacieho - preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
41. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí:
 - odovzdanie predmetu Zmluvy sa bude realizovať pre každý z dvoch úsekov cesty samostatne
 - Protokol o odovzdaní a prevzatí úseku cesty (ďalej len „Preberací protokol“) vyhotoví Zhotoviteľ v štyroch (4) origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude zodpovednými osobami uvedenými v Článku VI. tejto Zmluvy. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdaného diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Preberací protokol musí jasne preukázať, že úsek cesty je spôsobilý na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu kvality, t. j. kontrolu toho, že práce boli zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto Zmluvy a jej príloh a cesta nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní, použije sa postup podľa tohto Článku ods. 21 až 24 tejto Zmluvy. Dva (2) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a dva (2) originály pre Zhotoviteľa.
 - ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí úseku cesty tento odovzdať vyčistený od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie rekonštrukčných prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.
42. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávanom - preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v papierovej a digitálnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) so zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane konštrukčných detailov a porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia diela,
- fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých úsekov v primeranom rozsahu na dátovom nosiči,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach,
- vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
- stavebný denník s rekapituláciou výmer v tlačenej forme,
- schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP),
- elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov v dvoch vyhotoveniach,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov.

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.

43. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
44. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
45. Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu. Nesplnenie požiadaviek a termínov uvedených vo výzve môže byť považované za podmienku pre uplatnenie zmluvnej pokuty podľa Článku XI. tejto Zmluvy.

Článok VIII. Subdodávateľia

1. Objednávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo Zhotoviteľ, a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Ak má Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel

zákazky, ktorý má v úmysle zadať, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí spĺňať aj podmienku podľa ods. 2 tohto Článku Zmluvy.

5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa Zhotoviteľa alebo subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná v dvoch platbách, a to samostatne za každý úsek cesty na základe Súpisu vykonaných prác a Preberacieho protokolu odsúhlasených Objednávateľom. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.
2. Uhradenie faktúry Objednávateľom je podmienené predložením potvrdenia o zložení garančnej záruky za príslušný úsek cesty zo strany Zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy.
3. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu Objednávateľovi.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapisujú do Preberacieho protokolu.
4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality zhotoveného diela nemá vplyv na trvanie záruky. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať písomné stanovisko k reklamácií Objednávateľa v súvislosti s odstránením prípadných väd diela do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, ktorý je na odstránenie vzniknutej vady diela potrebný. Spôsob odstránenia a lehotu je povinný predložiť súčasne s písomným stanoviskom k reklamácií Objednávateľovi na odsúhlasenie. Ak sa na lehote odstránenia väd Zmluvné strany nedohodnú, platí lehota na odstránenie väd, ktorú určí Objednávateľ.
6. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

Článok XI. Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne stanovenom v Článku V. ods. 1 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
2. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z termínov realizácie diela uvedených v Článku V. tejto Zmluvy alebo v Harmonogramoch prác, ktoré sú prílohou č. 1A a 1B tejto Zmluvy, alebo ak Zhotoviteľ v súlade s Článkom VII. ods. 11 tejto Zmluvy nepredloží upravený Harmonogram prác ani po uplynutí určenej lehoty, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za príslušný úsek cesty s DPH, a to za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
3. V prípade, ak Zhotoviteľ neobnoví/nedoplní výkonnosťnú alebo garančnú záruku v lehote a/alebo do plnej výšky stanovenej v Článku IV. ods. 1 alebo ods. 4, má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do celkovej výšky zloženej záruky uvedenej v Článku IV ods. 1 alebo ods. 4 Zmluvy.
4. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá úsek cesty s vadami a tieto vady neodstráni v zmysle Článku X. tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za príslušný úsek cesty s DPH, a to za každý deň omeškania Zhotoviteľa s jeho odovzdaním bez väd. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa. Rovnaké právo na zmluvnú pokutu vzniká Objednávateľovi i v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd reklamovaných počas plynutia záručnej doby.
5. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
6. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, bude to považované za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
7. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu najmenej vo výške 10 % (desať percent) z ceny diela bez DPH z dôvodu porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom v zmysle Článku XII. ods. 5 piatej a šiestej odrážky tejto Zmluvy, keď je Objednávateľ zároveň oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
8. Objednávateľ bude zmluvne sankcionovať porušenie povinnosti vykonávať v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vymedzené typy prác vlastnými kapacitami (kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev) Zhotoviteľa. Za porušenie povinnosti realizovať vyhradené plnenie vlastnými kapacitami Zhotoviteľa bude Zhotoviteľovi uložená zmluvná pokuta vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa.
9. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.
10. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v Článku XII. ods. 5 tejto Zmluvy.

Článok XII. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam Zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre Objednávateľa prijateľné.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak Zhotoviteľ neprevzal stavenisko v lehote podľa Článku V. ods. 1 tejto Zmluvy
 - ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,
 - nesplnenie povinnosti poskytnutia alebo doplnenia výkonnostnej alebo garančnej záruky,
 - nesplnenie si povinnosti Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
 - ak poisťňa zmluvy podľa Článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy neboli v stanovenom čase uzatvorené, ich uzatvorenie nebolo preukázané alebo stratili platnosť počas trvania zmluvného vzťahu vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných očíslovaných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami planého zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvárania dodatku.
3. Naviac práce môžu byť realizované len na základe zmeny Zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve. V opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonať naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený oboma Zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatku a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatneniu zmenenej ceny vo faktúre.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť len písomnou formou.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo Zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde.
7. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

8. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve, na ktorú sa viaže vznik nároku inej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty, je splatná na základe výzvy druhej Zmluvnej strany. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany domáhať sa od druhej Zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
9. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Prílohy Zmluvy:

Príloha č. 1A - Harmonogram prác k úseku cesty II/561 Topoľníky – Jánoštelek, km 30,287 – 33,067

Príloha č. 1B – Harmonogram prác k úseku cesty II/561 Jánoštelek – Opatovský Sokolec, 33,067 – 36,259

Príloha č. 2A - Ponukový rozpočet k úseku cesty II/561 Topoľníky – Jánoštelek, km 30,287 – 33,067

Príloha č. 2B – Ponukový rozpočet k úseku cesty II/561 Jánoštelek – Opatovský Sokolec, 33,067 – 36,259

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Trnave, dňa 12.09.2022

Za Objednávateľa:

v.r.

Ing. Dalibor Trebichalský

Riaditeľ

Správa a údržba ciest

Trnavského samosprávneho kraja

V Bratislave, dňa 05. SEP. 2022

Za Zhotoviteľa:

v.r.

Ing. Vladimír Kríž

riaditeľ Závodu Bratislava

**v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.**

v.r.

Ing. Peter Farko

zástupca riaditeľa Závodu
Bratislava

**v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.**

PRÍLOHA Č. 1A ZMLUVY

HARMONOGRAM PRÁČ

K ÚSEKU CESTY II/561 TOPOLNÍKY – JÁNOŠTELEK, KM 30,287 – 33,067

Projekt: Harm Rekonstrukcija ko
 Datum: 28.6.22


Uloha	Slovo	Neaktivni mediji	Izbrane	Iz odprtok	Estimativni	Manjše prebrano
Razpis	Slovo projekta	Neaktivni slovo	Manjše slovo	Iz odprtok	Termin	
Mediji	Neaktivna Uloha	Manjše Uloha	Manjše slovo	Estimativni Uloha	Prebrano	

Strana 1

PRÍLOHA Č. 1B ZMLUVY

HARMONOGRAM PRÁC

K ÚSEKU CESTY III/561 JÁNOŠTELEK – OPATOVSKÝ SOKOLEC, KM 33,067 – 36,259

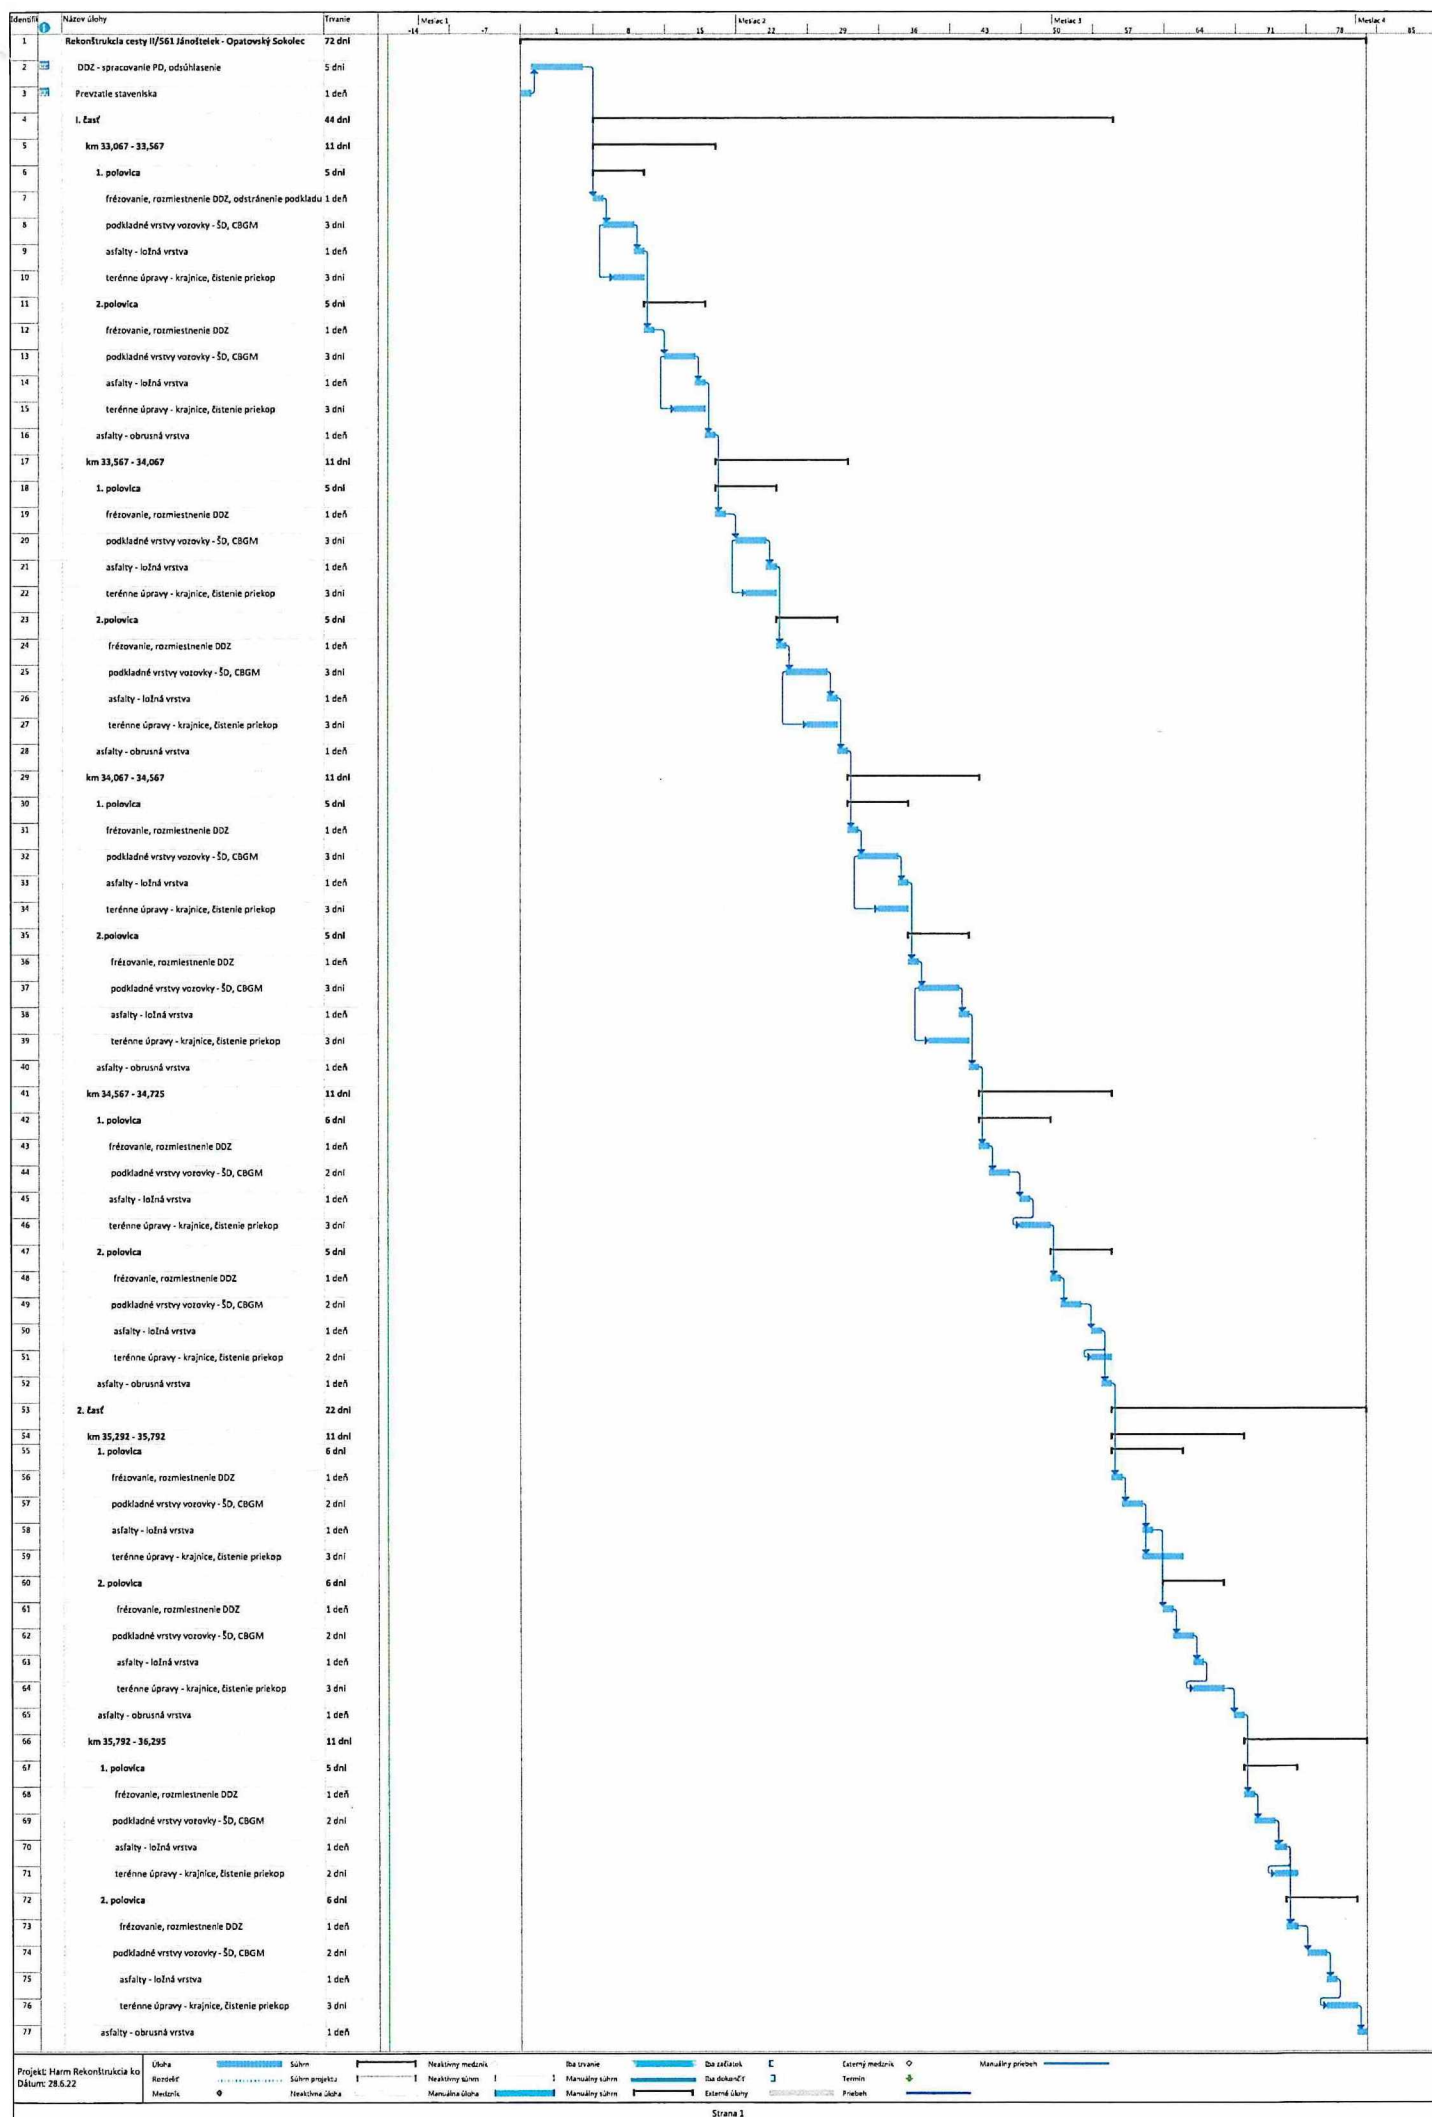

PRÍLOHA Č. 2A ZMLUVY

PONUKOVÝ ROZPOČET

K ÚSEKU CESTY III/561 TOPOLNÍKY – JÁNOŠTELEK, KM 30,287 – 33,067

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - Jánoštelek - Opatovský Sokolec, km 30,287 - 36,259

Objekt: **05 - Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky - Jánoštelek**

Miesto: Dunajská Streda

Dátum: 16.6.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. závod Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

646 857,10

D HSV Práce a dodávky HSV 644 007,10

D 1.1 Zemné práce - Búracie práce 30 975,36

1	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	45 890,400	0,65	29 828,76
2	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 0,72000t	m2	882,000	1,30	1 146,60

D 5 Komunikácie 563 011,08

3	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	882,000	11,50	10 143,00
4	K	567143112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 220 mm	m2	882,000	18,45	16 272,90
5	K	572701111.S.1	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	1 644,000	4,50	7 398,00
6	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	2 794,800	7,50	20 961,00
7	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	19 121,000	0,65	12 428,65
8	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	19 121,000	0,60	11 472,60
9	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	19 121,000	10,80	206 506,80
10	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	19 121,000	12,30	235 188,30
11	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextíliou	m2	19 121,000	0,25	4 780,25
12	M	693210000320.S	Geomreža polypropylénová s PP geotextíliou, šxI 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	21 033,100	1,80	37 859,58

D 5.1 Komunikácie - zlepšenie podložia 14 445,40

13	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	361,620	6,30	2 278,21
14	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	361,620	0,50	180,81
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	361,620	2,20	795,56
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6 147,540	0,40	2 459,02
17	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	882,000	2,50	2 205,00
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	882,000	3,50	3 087,00
19	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny 63-128 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	882,000	3,90	3 439,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 32 997,75

20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2 606,954	1,10	2 867,65
21	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosov nad 0,15 do 0,30 m3/m, - 0,19460 t	m	5 200,000	1,55	8 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	938909611.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	2 740,000	1,45	3 973,00
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8 435,035	0,28	2 361,81
24	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	160 265,665	0,08	12 821,25
25	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5 828,081	0,50	2 914,04
D 99			Presun hmôt HSV				2 577,51
26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	12 887,536	0,20	2 577,51
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				2 850,00
D VRN04			Projektové práce				2 850,00
27	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, autorský dozor	kpl	1,000	850,00	850,00
28	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

PRÍLOHA Č. 2B ZMLUVY

PONUPOVÝ ROZPOČET

K ÚSEKU CESTY III/561 JÁNOŠTELEK – OPATOVSKÝ SOKOLEC, KM 33,067 – 36,259

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia cesty II/561 Topolníky - Jánoštelek - Opatovský Sokolec, km 30,287 - 36,259

Objekt:

06 - Rekonštrukcia cesty II/561 Jánoštelek - Opatovský Sokolec

Miesto:

Dunajská Streda

Dátum:

16.6.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s. závod Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

647 888,11

D HSV

Práce a dodávky HSV

645 038,11

D 1.1

Zemné práce - Búracie práce

30 183,40

1	K	113152730.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	43 212,000	0,65	28 087,80
2	K	113307225.S	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 0,72000t	m2	1 612,000	1,30	2 095,60

D 5

Komunikácie

551 925,18

3	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 612,000	11,50	18 538,00
4	K	567143112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 220 mm	m2	1 612,000	18,45	29 741,40
5	K	572701111.S.1	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	1 453,500	4,50	6 540,75
6	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	2 470,950	7,50	18 532,13
7	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	18 005,000	0,65	11 703,25
8	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	18 005,000	0,60	10 803,00
9	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	18 005,000	10,80	194 454,00
10	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	18 005,000	12,30	221 461,50
11	K	919720112.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu s geotextíliou	m2	18 005,000	0,25	4 501,25
12	M	693210000320.S	Geomreža polypropylénová s PP geotextíliou, šxI 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	m2	19 805,500	1,80	35 649,90

D 5.1

Komunikácie - zlepšenie podlažia

26 401,34

13	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	660,920	6,30	4 163,80
14	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	660,920	0,50	330,46
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	660,920	2,20	1 454,02
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 235,640	0,40	4 494,26
17	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 612,000	2,50	4 030,00
18	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 612,000	3,50	5 642,00
19	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny 63-128 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	1 612,000	3,90	6 286,80

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

33 888,20

20	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3 532,276	1,10	3 885,50
----	---	-------------	---	---	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, - 0,19460 t	m	4 845,000	1,55	7 509,75
22	K	938909611.S	Odstránenie nánosov na krajiniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m ²	2 422,500	1,45	3 512,63
23	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9 020,200	0,28	2 525,66
24	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	171 383,800	0,08	13 710,70
25	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5 487,924	0,50	2 743,96
D 99			Presun hmôt HSV				2 639,99
26	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13 199,941	0,20	2 639,99
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				2 850,00
D VRN04			Projektové práce				2 850,00
27	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, autorský dozor	kpl	1,000	850,00	850,00
28	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

PRÍLOHA Č. 3 ZMLUVY

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Uchádzač/skupina dodávateľov:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: „**Rekonštrukcia cesty II/561 Topoľníky – Jánoštelek – Opatovský Sokolec**“, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja** so sídlom Bulharská 39, 918 53 Trnava vo Vestníku verejného obstarávania č. 137/2022 zo dňa 15.6.2022, značka 29528-WYP:

- ☐ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ¹	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1	SAT SLOVENSKO s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava	44 628 480	Ing. Radoslav Prokop Nar. Ing. Mária Melichová Nar.	4,47 %	Frézovanie asfaltového krytu
2					
3					

V Bratislave, dňa: 05. SEP. 2022

v.r.

Ing. Vladimír Kríž
riaditeľ Závodu Bratislava
v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.

v.r.

Ing. Peter Farko
zástupca riaditeľa Závodu Bratislava
v súlade s platným podpisovým
poriadkom Doprastav, a.s.
