DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
Obchodné meno: **Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja**
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Osoba zodpovedná za zmluvné dojednania:
Ing Monika Zaťková
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 37847783
IČ DPH: SK 2021777516
neplatiteľ DPH (iná osoba pre daň podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)
DIČ: 2021777516
telefón:
e-mail:
(ďalej aj len ako „***Objednávateľ***“)
a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: **SMS a.s.**
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 692/S
Sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva
Ing. Eva Fízeľová – podpredseda predstavenstva
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
za zmluvné dojednania: Ing. Eva Fízeľová
e-mail:
za technické dojednania: Ing. Maroš Macháček
telefón:
e-mail:
stavbyvedúci: Ing. Maroš Macháček
telefón:
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:

IBAN:
IČO: 35727951
DIČ: 2020268173
IČ DPH: SK2020268173
(ďalej aj len ako „***Zhotoviteľ***“)

(ďalej spoločne len „*Zmluvné strany*“ a jednotlivo „*Zmluvná strana*“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 18.06.2025 zmluvu o dielo, ktorá nadobudla účinnosť dňa 20.06.2025 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2025 a dodatku č. 2 zo dňa 21.07.2026 a predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo – stavebné práce „Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov brod, okres Galanta“ (ďalej aj „*Dielo*“) a záväzok Objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou o dielo vykonané dielo prevziať a uhradiť zaň dohodnutú cenu (ďalej aj „*Zmluva*“).

2. V súlade s Článkom 2 bodom 2.2, s článkom 8 bodom 8.2 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písmeno a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „*zákon o verejnom obstarávaní*“) sa zmluvné strany dohodli na navýšení ceny za Dielo a uzavretí dodatku k Zmluve (ďalej aj „*Dodatok*“) z dôvodu potreby vykonania naviac prác, ktoré boli vyvolané zmenami technického riešenia v projektovej dokumentácii v nadväznosti na skutočný stav a potreby stavby, ktoré nebolo možné predvídať žiadnou zo zmluvných strán pred uzavretím Zmluvy, pričom týmito zmenami sa nemení charakter Zmluvy. Zmeny majú vplyv na Cenu za Dielo v nasledujúcom rozsahu:

		Cena bez DPH	Hodnota DPH	Cena s DPH
Cena za Dielo podľa Zmluvy		1 242 362,87 €	285 743,46 €	1 528 106,33 €
Cena za Dielo v zmysle Dodatku č. 2	Zmenový list č. 1	21 902,69 €	5 037,62 €	26 940,31 €
	Zmenový list č. 2	45 977,24 €	10 574,77 €	56 552,01 €
	Zmenový list č. 3	12 476,75 €	2 869,65 €	15 346,40 €
	Zmenový list č. 4	7 645,58 €	1 758,48 €	9 404,06 €
	Zmenový list č. 5	3 900,96 €	897,22 €	4 798,18 €
	Spolu:	91 903,22 €	21 137,74 €	113 040,96 €
Cena za Dielo v zmysle Dodatku č. 3	Zmenový list č. 6	6 817,97 €	1 568,13 €	8 386,10 €
	Zmenový list č. 7	20 780,42 €	4 779,50 €	25 559,92 €
	Zmenový list č. 8	657,72 €	151,28 €	809,00 €
	Zmenový list č. 9	10 633,22 €	2 445,64 €	13 078,86 €
	Zmenový list č. 10	11 555,27 €	2 657,71 €	14 212,98 €
	Zmenový list č. 11	33 281,65 €	7 654,78 €	40 936,43 €
	Zmenový list č. 12	7 073,65 €	1 626,94 €	8 700,59 €
	Zmenový list č. 13	1 848,90 €	425,25 €	2 274,15 €
	Spolu:	92 648,80 €	21 309,23 €	113 958,03 €
Celkom spolu:		**1 426 914,89 €**	**328 190,43 €**	**1 755 105,32 €**

3. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok v nasledujúcom znení:

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou sa rozširuje v súlade so zmenovými listami – Zmenový list č. 6 – oceľové konzoly - podopretie vodovodu, Zmenový list č. 7 – preložka súkromného kábla, Zmenový list č. 8 – opakovaná tlaková skúška plynovodu, Zmenový list č. 9 – dodatočné náklady z titulu predĺženia stavby, Zmenový list č. 10 – navýšenie množstva zásypu v prechodových oblastiach, Zmenový list č. 11 – výmena podložia SO 01, Zmenový list č. 12- zmena asfaltov SO 01, Zmenový list č. 13 – úhrada za vydobyté primárne suroviny, ktoré spolu tvoria prílohou č. 1B tohto Dodatku a tým dopĺňajú Prílohu č. 1 Zmluvy – Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet. Príloha č. 1B tohto Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 1 Zmluvy bod 1.1 písmeno a) sa mení a bude mať nasledujúce znenie:

   (a) **Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **1 755 105,32 EUR** (slovom: jeden milión sedemstopäťdesiatpäťtisíc stopäť eur, 32/100 eurocentov) **s DPH**, ktorej súčasťou je DPH vo výške 328 190,43 EUR, t. j. 1 426 914,89 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom neupravené, zostávajú v pôvodnom znení
2. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ a dva (2) Zhotoviteľ.
3. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

   Príloha č. 1B:

   Zmenový list č. 6 – oceľové konzoly - podopretie vodovodu

   Zmenový list č. 7 – preložka súkromného kábla

   Zmenový list č. 8 – opakovaná tlaková skúška plynovodu

   Zmenový list č. 9 – dodatočné náklady z titulu predĺženia stavby

   Zmenový list č. 10 – navýšenie množstva zásypu v prechodových oblastiach

   Zmenový list č. 11 – výmena podložia SO 01

   Zmenový list č. 12 – zmena asfaltov SO 01

   Zmenový list č. 13 – úhrada za vydobyté primárne suroviny

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

V Trnave, dňa 13.11.2026

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

----------v. r. ----------
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský
funkcia: riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa 11.11.2026

SMS a.s.

----------v. r. ----------
Meno: Ing. Róbert Šinály
predseda predstavenstva

----------v. r. ----------
Meno: Ing. Eva Fízeľová
podpredseda predstavenstva
funkcia: riaditeľ spoločnosti

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Poradové číslo zmenového listu: 6

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Názov zmeny: Oceľové konzoly - podopretie vodovodu

Popis zmeny: Predmetom zmena je realizácia stáleho podopretia vodovodu

Zdôvodnenie zmeny: Potreba realizácie nových oceľových konzol vznikla v súvislosti s nevyhnutnosťou zabezpečiť trvalé podopretie existujúceho vodovodného potrubia po odstránení pôvodnej konštrukcie mosta a vybudovaní nových úložných prahov. Realizácia oceľových konzol nebola zahrnutá v zmluvnom rozpočte stavby, a teda ani v pôvodnej zmluvnej cene diela. Bez realizácie predmetných konzol by nebolo možné zabezpečiť požadované trvalé uloženie a podopretie existujúceho vodovodného potrubia na novej konštrukcii mosta.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 6

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD: áno/nie

Harmonogram prác: áno/nie

Cenu za Dielo: áno/nie

Zvýšenie o:	**6 817,97 €**	**bez DPH**
	8 386,10 €	**s DPH**

Zníženie o:		bez DPH
		s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny: SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ realizuje oceľové konzoly na trvalé podopretie existujúceho vodovodného potrubia v súlade s projektovou dokumentáciou stupňa DVP a uplatňuje si nárok na úhradu nákladov spojených s ich dodávkou a montážou, nakoľko predmetné oceľové konzoly neboli zahrnuté v zmluvnom rozpočte stavby.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 9.7.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 6

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	J. cena	Cena celkom
Odpočty							
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
Prípočty							
			Oceľové konzoly na podopretie vodovodu s kĺzným uložením	ks	4	1 704,49	6 817,97

Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 6**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	


Poznámky:

Prílohy k ZL:


Príloha č.1: Výkres - oceľová konzola vodovodu - DVP

OCEĽOVÁ KONZOLA VODOVODU


REZ V OSI PILIERA 2 1:25

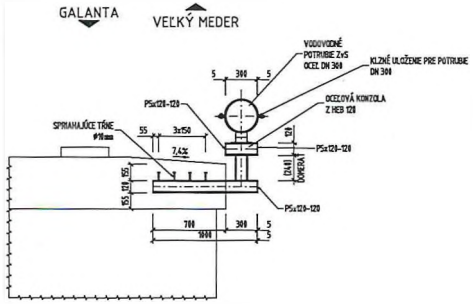

POZDĹŽNY REZ 1–1 1:25

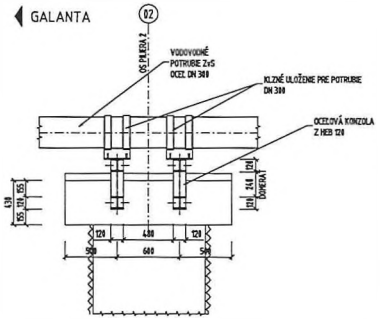

TVAR KONZOLY 1:10




OCEĽOVÁ KONZOLA								
Položka	Popis	Mj	1 Ks v/Plocha (M2)	Počet [ks]	Hmotnosť [kg] Mj	Hmotnosť [kg]	Hmotnosť [kg]
1	HEB 120	m	1.000	1	26.7	26.7	26.7
2*	HEB 120	m	0.240	1	26.7	6.4	6.4
3	HEB 120	m	0.300	1	26.7	8.0	8.0
4	Tŕňa [illegible]	m	0.000	4	0.82	0.0	0.2
P1	PSx120-120	m2	0.014	3	39.25	0.5	1.7
						Spolu 1ks	43.0
						Spolu 4ks	172.0


POZN: Položky označené (*) je možné dodrnúť na stavbe podľa presnej polohy vrchnej rany

POZNÁMKY:

- ROZMERY A UMIESTNENIE OCEĽOVEJ KONZOLY VODOVODU BUDE OVERENÉ PRED VÝROBOU NA STAVBE ZHOTOVITEĽOM STAVBY
- BETONÁRSKA VÝSTUŽ PILIERA V MIESTE ULOŽENIA OCEĽOVEJ KONZOLY BUDE VYPOSÚVANÁ.
- V POLOHA VLEPOVANÝCH VÝSTUŽÍ PILIERA V MIESTE ULOŽENIA OCEĽOVEJ KONZOLY SA MUSÍ UPRAVIŤ NA STAVBE TAK, ABY BOLO MEDZI VÝSTUŽOU A OCEĽOVOU KONZOLOU MIN. 20 mm
- VEĽKOSŤ A ROZMERY KĽZNÉHO ULOŽENIA VODOVODU SA OVESÍ PRED VÝROBOU ZHOTOVITEĽOM STAVBY

Prevedenie oceľovej konštrukcie		
1.	Výroba certifikovaný výrobca:	Podľa STN EN ISO 1090-2 EXC2
2.	Trieda tolerancie prevedenia OK:	Výrobné a montážne tolerancie profilu STN EN ISO 1090-2, bodom 11.3, 11.4, viď prílohu D1.1 až D1.27
3.	Zváranie zvarmi:	Podľa STN EN ISO 3834-3 Prípustné zvarových spôsobov podľa STN EN ISO 9692-1, STN EN ISO 5817-2
4.	Kontrola zvarov:	Vizuálna kontrola 100% – Tab.24-STN EN ISO 10332-2 (NDT_%)
5.	Úprava povrchu pred nátermi:	Stupeň úpravy povrchu Sa 2 1/2 podľa STN EN ISO 12944-4.
6.	Zhotovenie nátieru:	Povrchová úprava: nátierový systém A.3.05 podľa STN EN ISO 12944-5, Protikorózny stupeň korózneho agresivity C5<vysoká>. Dokázaná životnosť minimálne 5. Farebný odtieň určí investor.

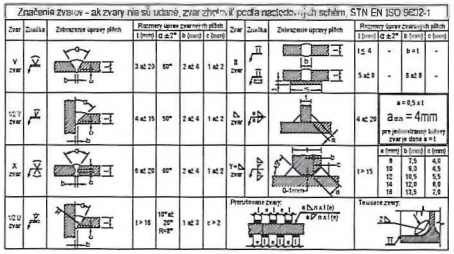

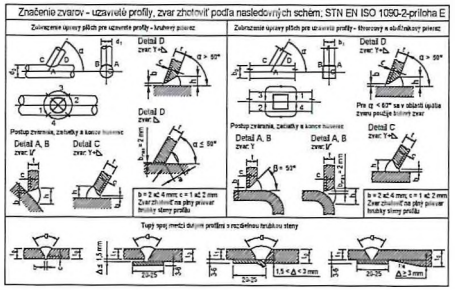

KONCEPT

D. PÍSOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKOV
D.3 MOSTNÉ OBJEKTY

OKRES: GALANTA
KRAJ: TRNAVSKÝ
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁĽOV BROD

STAVBA:
REKONŠTRUKCIA MOSTA M999 V KM 16,969 NA CESTE II/561 V OBCI KRÁĽOV BROD, OKRES GALANTA

ZHOTOVITEĽ: SUC TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava	vypracoval	ING. J. MAJERČÍK		dátum	03/2025
	zodp. projektant	ING. M. KRAJČÍ		stupeň	DvP
				mierka	1:25;10
	objekt: SO-02	REKONŠTRUKCIA MOSTA M999		č.prílohy: 22.	časť
	príloha:	OCEĽOVÁ KONZOLA VODOVODU			

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: **44/2025/SÚCTt**

Poradové číslo zmenového listu: 7

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Názov zmeny: Preložka súkromného kábla

Popis zmeny: Predmetom zmeny je realizácia preložky súkromného kábla, ktorý sa nachádza v ľavej rímse.

Zdôvodnenie zmeny: Počas realizácie stavebných prác bol v konštrukcii mostnej rímsy zistený existujúci súkromný kábel, ktorý nebol zakreslený v projektovej dokumentácii ani evidovaný v dostupných podkladoch o inžinierskych sieťach. Z dôvodu kolízie s navrhovanými stavebnými prácami je nevyhnutné vykonať jeho preloženie.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 7

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD:	áno/nie
Harmonogram prác:	áno/nie
Cenu za Dielo:	áno/nie

Zvýšenie o:	20 780,42 €	bez DPH
	25 559,92 €	s DPH

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny: SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác zistil existenciu súkromného kábla uloženého v mostnej rímse, ktorý nebol zakreslený v projektovej dokumentácii ani v dostupných podkladoch. Z dôvodu kolízie s navrhovanými stavebnými prácami nie je možné pokračovať v realizácii a uplatňuje si nárok na úhradu, nakoľko predmetné práce neboli súčasťou dokumentácie DRS ani zmluvného výkazu výmer.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 21.7.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v.r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 7

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	J. cena	Cena celkom
			Odpočty				
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
			Prípočty				
	1	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím (4x štartovacie jamy, 2xjamy pre spojky)	m3	10	148,40	1 484,00
	2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10	31,50	315,00
	3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,075	105,02	1 058,08
	4	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,075	18,20	183,37
	5	141721115.S	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 125 do 160mm	m3	12	248,50	2 982,00
	6	*286130072500.S*	*Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE*	*m*	*24,8*	8,64	*214,27*
	7	*286130072800.S*	*Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110 + montáž*	*m*	*65,2*	118,60	*7732,72*
	8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,525	15,00	127,88
	9	210101542.x	Spojka Raychem POLJ-24/1x12-240	ks	2	756,00	1 512,00
	10	210810066.S	Kábel AYKY- 4x240 montáž + príplatok za vťahovanie kábla do 6 kg	m	100	10,20	1 020,00
	11	*341110006500.S*	*Kábel Ayky-j 4x240*	*m*	*100*	34,50	*3450*
	12	*283230008000.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená*	*m*	*12,8*	0,72	*9,22*
	13	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	31	8,05	249,55
	12	*581530002100.S*	*Piesok kremičitý, frakcia 0,3-0,8 mm, balenie 1000 kg*	*t*	*3,224*	137,20	*442,33*


Spolu **20 780,42**

Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 7**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	

Poznámky:

Prílohy k ZL:

Príloha č.1: Výkres - preložka súkromného kábla

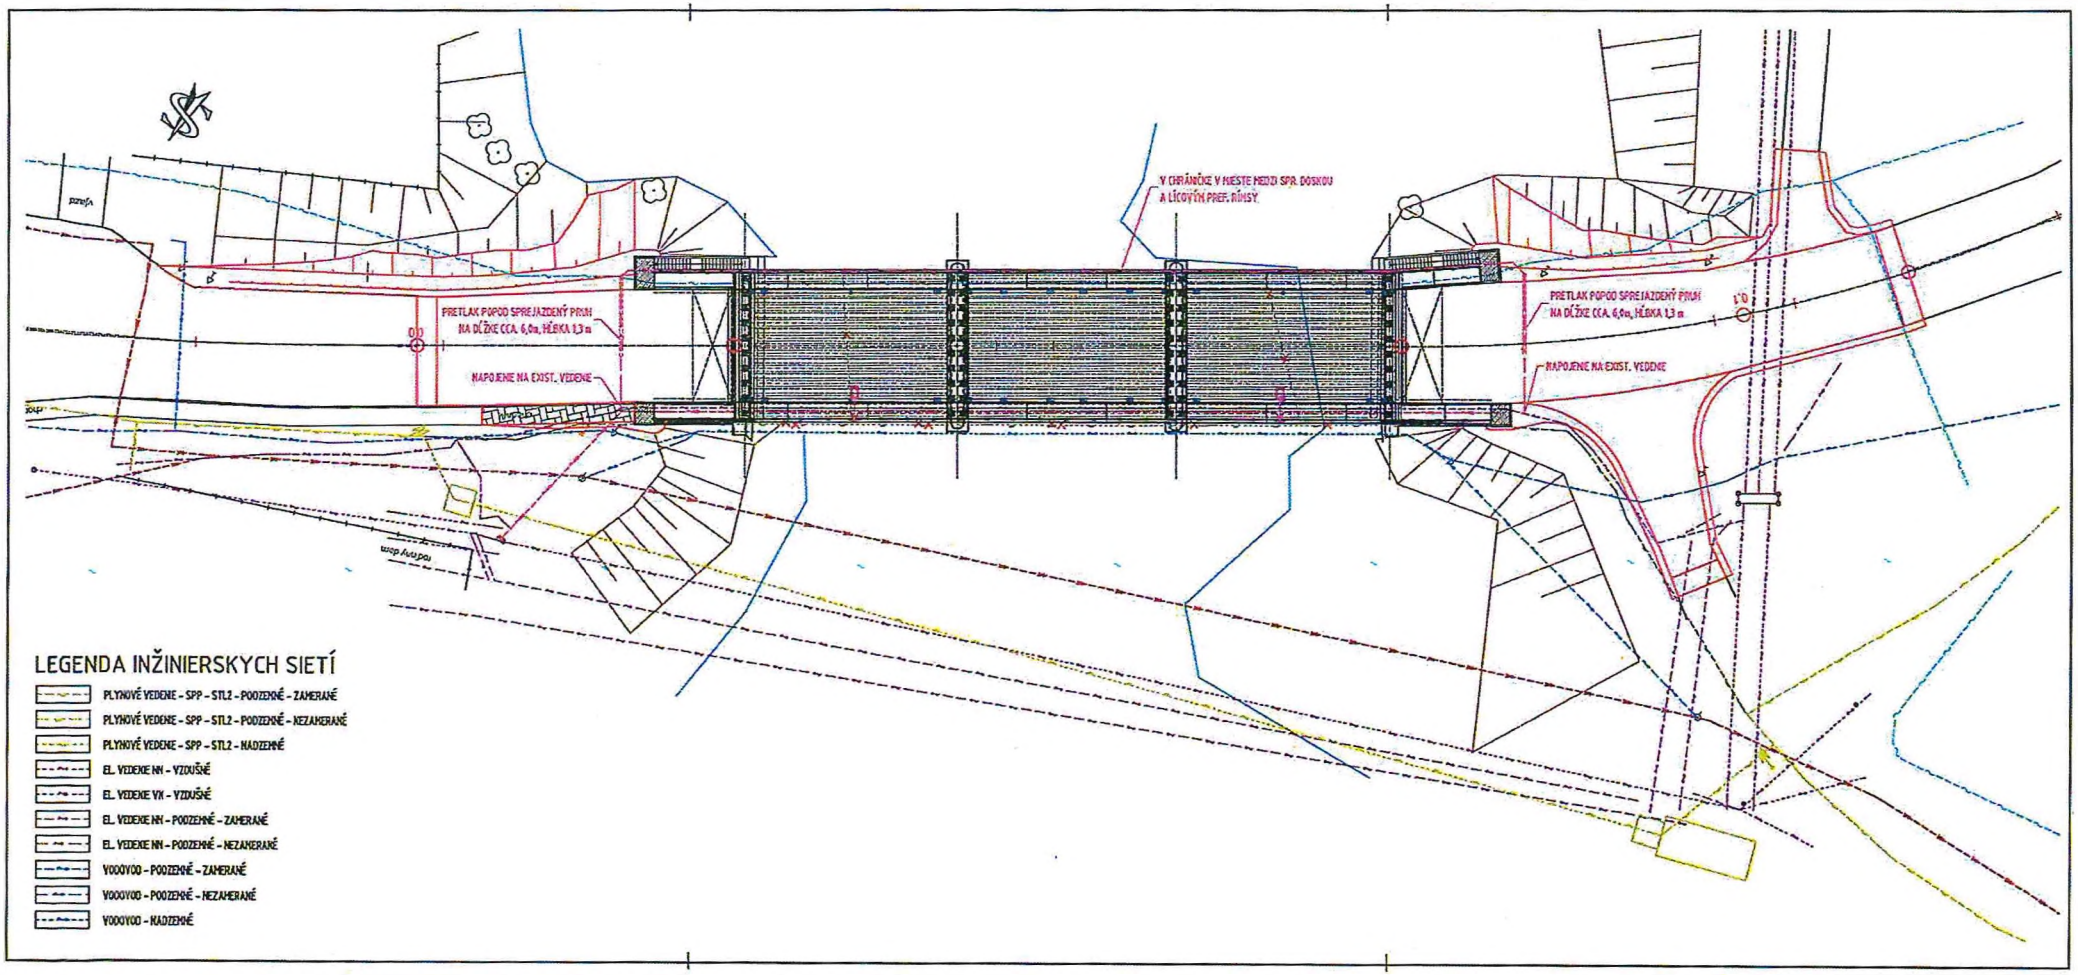
V CHRÁNIČKE V MIESTE MEDZI SPR. DOSKOU A LÍCOVÝM PREF. PRVKOM
PRETLAK POPOD SPREJAZDENÝ PRVOK NA DĹŽKE CCA. 6,0m, HĹBKA 1,3 m
NAPOJENIE NA EXIST. VEDENIE
PRETLAK POPOD SPREJAZDENÝ PRVOK NA DĹŽKE CCA. 6,0m, HĹBKA 1,3 m
NAPOJENIE NA EXIST. VEDENIE
LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETÍ
PLYNOVÉ VEDENIE - SPP - STL2 - PODZEMNÉ - ZAMERANÉ
PLYNOVÉ VEDENIE - SPP - STL2 - PODZEMNÉ - NEZAMERANÉ
PLYNOVÉ VEDENIE - SPP - STL2 - NADZEMNÉ
EL. VEDENIE NN - VZDUŠNÉ
EL. VEDENIE VN - VZDUŠNÉ
EL. VEDENIE NN - PODZEMNÉ - ZAMERANÉ
EL. VEDENIE NN - PODZEMNÉ - NEZAMERANÉ
VODOVOD - PODZEMNÉ - ZAMERANÉ
VODOVOD - PODZEMNÉ - NEZAMERANÉ
VODOVOD - NADZEMNÉ

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Poradové číslo zmenového listu: 8

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Názov zmeny: Opakovaná tlaková skúška plynovodu

Popis zmeny: Predmetom zmeny je opakované vykonanie úradnej tlakovej skúšky preložky plynovodu SO 03.

Zdôvodnenie zmeny: Potreba opakovanej tlakovej skúšky vznikla v dôsledku časového odstupu medzi vykonaním prvej tlakovej skúšky a možnosťou realizácie ostrého prepoja plynovodu. Zhotoviteľ nemohol termín ostrého prepoja ovplyvniť, nakoľko jeho vykonanie bolo podmienené splnením podmienok vyplývajúcich z dohody medzi Objednávateľom a spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. Z uvedeného dôvodu nebolo možné uviesť plynovod do prevádzky v lehote platnosti prvej tlakovej skúšky a bolo nevyhnutné zabezpečiť jej opakované vykonanie.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 8

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD: áno/nie

Harmonogram prác: áno/nie

Cenu za Dielo: áno/nie

Zvýšenie o:	**657,72 €**	**bez DPH**
	809,00 €	**s DPH**

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny:

SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ zabezpečil opakované vykonanie úradnej tlakovej skúšky preložky plynovodu z dôvodu nemožnosti uvedenia plynovodu do prevádzky v lehote 6 mesiacov od vykonania prvej tlakovej skúšky a uplatňuje si nárok na úhradu nákladov spojených s jej opakovaným vykonaním.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 30.9.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 8

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	J. cena	Cena celkom
Odpočty							
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
Prípočty							
	46	230230003.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 100	m	116	5,67	657,72

Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 8**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	

Poznámky:

Prílohy k ZL:

Príloha č.1: Úradná tlaková skúška 14.11.2025

Úradná tlaková skúška 18.5.2026

ZÁPIS O OPAKOVANEJ TLAKOVEJ SKÚŠKE

podľa TPP 702 01, STN EN 12327

ČÍSLO
OS1/5/2026

Názov stavby:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta
Objednávateľ:	Správa a údržba ciest trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 5755/39, Trnava
Objekt:	**SO 03 – Preložka plynovodu**
Miesto:	km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod

Zhotoviteľ:	Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, Biely Kostol
Číslo oprávnenia:	172/4/2012 – PZ – S,O(OU,R,M) – Ad,f,g,h,Bd,f,g,h1

Technické údaje plynovodu:	
Použité potrubie:	polyetylén PE 100 RC, SDR 11
Armatúry:	-
Uzávery:	-

Potrubie:	63 PE	-	-	-	d
Dĺžka:	116,09	-	-	-	m

Tlaková skúška začatá dňa:	18. 5. 2026	o	8^{15}	hod.
Tlaková skúška skončená dňa:	18. 5. 2026	o	13^{15}	hod.

Druh dopravovaného plynu:	Zemný plyn	**Skušobné médium:**	Vzduch
Prevádzkový pretlak:	300 kPa	**Skušobný pretlak:**	600 kPa/100 kPa

Druh použitého tlakomera:	Kontrolný tlakomer, presnosť 0,6%, výr.č.201603-301, merací rozsah 0 - 1 MPa, kalibrovaný 19. 6. 2024 Digitálny tlakomer ROTEST GW Digital, výr.č. 4113, sonda 0-20 bar, výr.č. 06.1277, kalibrovaná 30. 1. 2026

Plynovod po tlakovej skúške:	**vyhovel**

Poznámka: Opakovaná tlaková skúška vykonaná z dôvodu neuvedenia zariadenia do prevádzky do 6 mesiacov od prvej tlakovej skúšky vykonanej dňa 14. 11. 2025.

v. r.

V: Trnave dňa: 18. 5. 2026

Tomáš Geryk
revízny technik PZ

ZÁPIS O TLAKOVEJ SKÚŠKE

podľa TPP 702 01, STN EN 12327

ČÍSLO **P1/11/2025**

Názov stavby:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta
Objednávateľ:	Správa a údržba ciest trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 5755/39, Trnava
Objekt:	**SO 03 – Preložka plynovodu**
Miesto:	km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod

Zhotoviteľ:	Termomont Dolná Krupá s.r.o., Vysoká 42, Biely Kostol
Číslo oprávnenia:	172/4/2012 – PZ – S,O(OU,R,M) – Ad,f,g,h,Bd,f,g,h1

Technické údaje plynovodu:	
Použité potrubie:	polyetylén PE 100 RC, SDR 11
Armatúry:	-
Uzávery:	-

Potrubie:	63 PE	-	-	-	d
Dĺžka:	116,09	-	-	-	m

Tlaková skúška začatá dňa:	14. 11. 2025	o	9^{00}	hod.
Tlaková skúška skončená dňa:	14. 11. 2025	o	14^{00}	hod.

Druh dopravovaného plynu:	Zemný plyn	**Skušobné médium:**	Vzduch
Prevádzkový pretlak:	300 kPa	**Skušobný pretlak:**	600 kPa/100 kPa

Druh použitého tlakomera:	Kontrolný tlakomer, presnosť 0,6%, výr.č.201603-301, merací rozsah 0 - 1 MPa, kalibrovaný 19. 6. 2024 Digitálny tlakomer ROTEST GW Digital, výr.č. 4113, sonda 0-20 bar, výr.č. 06.1277, kalibrovaná 31. 1. 2024

Plynovod po tlakovej skúške:	**vyhovel**

v. r.

V: Trnave dňa: 14. 11. 2025

Tomáš Geryk
revízny technik PZ

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Poradové číslo zmenového listu: 9

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Názov zmeny: Dodatočné náklady z titulu predĺženia stavby

Popis zmeny: Predmetom zmeny sú dodatočné náklady na zabezpečenie prevádzky a údržby zariadenia staveniska a dočasného dopravného značenia počas obdobia prerušenia prác. Práce boli pozastavené od 30. 3. 2026 z dôvodu nevyriešených preložiek inžinierskych sietí, pričom postupne bolo potrebné vyriešiť preložku plynovodu, preložku NN káblov a preložku súkromného kábla. Posledná prekážka bola odstránená dňa 3. 8. 2026.

Zdôvodnenie zmeny: Potreba vynaloženia dodatočných nákladov vznikla v dôsledku nemožnosti pokračovať v realizácii II. etapy výstavby mosta z dôvodu nevyriešených preložiek inžinierskych sietí. Vznik ani trvanie týchto prekážok neboli spôsobené konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa. Napriek prerušeniu prác bolo potrebné počas celého obdobia zabezpečovať prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a dočasného dopravného značenia. Tieto náklady vznikli nad rámec pôvodne predpokladanej doby realizácie Diela a Zhotoviteľovi by bez vzniku predmetných prekážok nevznikli.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 9

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD: áno/nie

Harmonogram prác: áno/nie

Cenu za Dielo: áno/nie

Zvýšenie o:	10 633,22 €	bez DPH
	13 078,86 €	s DPH

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny:

Podpis:

SMS a.s.

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Podpis:

Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu dodatočných nákladov vzniknutých v období prerušenia prác z dôvodu prekážok, ktoré neboli spôsobené konaním ani opomenutím Zhotoviteľa, a počas ktorého bol Zhotoviteľ povinný naďalej zabezpečovať prevádzku a údržbu zariadenia staveniska a dočasného dopravného značenia.

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 30.9.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 9

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	J. cena	Cena celkom
			Odpočty				
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
			Prípočty				
	6	000600001.1.S	Zariadenie staveniska	kpl	4	2 402,33	9 609,32
	7	000600024.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	0,4	2 559,75	1 023,90

Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 9**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	

Poznámky:

Prílohy k ZL:

ZMENOVÝ LIST

Stavba: **Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta** **Zmenový list č.: 10**

Stavebný objekt: **SO 02 - Rekonštrukcia mosta**

Číslo ZoD: **44/2025/SÚCTt**

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: **44/2025/SÚCTt**

Poradové číslo zmenového listu: 10

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Názov zmeny: Navýšenie množstva zásypu v prechodových oblastiach

Popis zmeny: Predmetom zmeny je navýšenie množstva zásypu prechodových oblastí mosta oproti množstvu uvedenému v zmluvnom výkaze výmer. Rozsah zásypu bol realizovaný podľa tvaru prechodových oblastí definovaného v projektovej dokumentácii stupňa DVP a na základe skutočného rozsahu výkopu a geometrie spodnej stavby. Skutočne realizované množstvo je preukázané geodetickým zameraním.

Zdôvodnenie zmeny: Množstvo zásypu uvedené v zmluvnom výkaze výmer nezodpovedalo rozsahu konštrukcie spodnej stavby mosta a prechodových oblastí definovaných v projektovej dokumentácii. Tvar prechodovej oblasti bol dodatočne definovaný v dokumentácii DVP. Rozsah výkopu a následného zásypu bol zároveň ovplyvnený dĺžkou krídel oboch opôr a potrebou vykonania skúšok únosnosti zásypu pod prechodovou doskou. Z uvedených dôvodov došlo k navýšeniu skutočne realizovaného množstva zásypu oproti množstvu zahrnutému v zmluvnom rozpočte.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 10

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD:	áno/nie
Harmonogram prác:	áno/nie
Cenu za Dielo:	áno/nie

Zvýšenie o:	11 555,27 €	bez DPH
	14 212,98 €	s DPH

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny: SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ realizuje zásyp prechodových oblastí mosta v rozsahu podľa projektovej dokumentácie stupňa DVP a uplatňuje si nárok na úhradu nákladov vzniknutých navýšením skutočného množstva zásypu oproti množstvu zahrnutému v zmluvnom rozpočte.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 30.9.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 10

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	j. cena	Cena celkom
			Odpočty				
	12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	105,6	25,74	- 2 718,14
	13	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	105,6	23,70	- 2 502,72
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
			Prípočty				
	12	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	215,41	25,74	5 544,65
	13	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	473,902	23,70	11 231,48


Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 10**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	

Poznámky:

Prílohy k ZL:

Príloha č.1 - Zameranie I. Etapa

Príloha č.2 - Zameranie II. Etapa

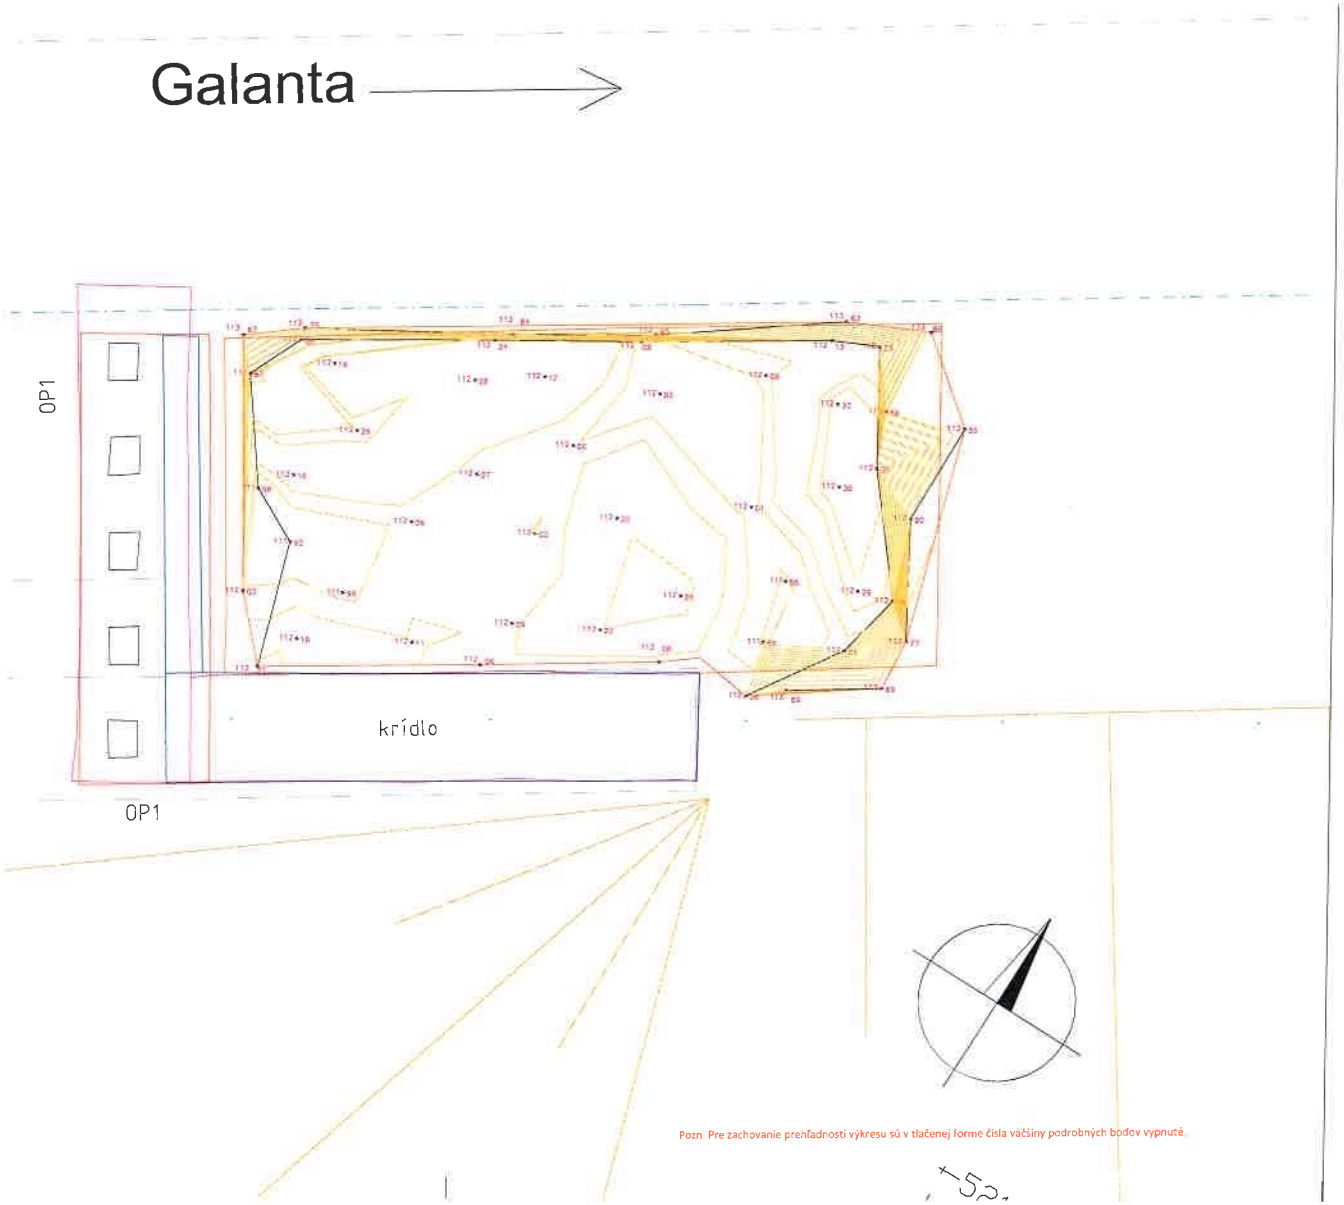


Legenda:			
Líniové prvky 1:		Líniové prvky 2:	
	pôvodný stav pilierov		vrch úložného prahu
	vrch kridiel a záverných múrikov		vrch prechodovej kapsy
	zarezanie		úložné bločky
	stredová os komunikácie		pôvodný stav komunikácie
	kraj vodného toku		terénna hrana


Objemy výkopov prechodových častí OP1 a OP4 (jamy):			
OP4	Plocha sp.časti: 48,60m2	Plocha hor.časti: 34,50m2	Objem: 51,62m3
OP1	Plocha sp.časti: 50,96m2	Plocha hor.časti: 35,12m2	Objem: 55,63m3

Pozn: Pre zachovanie prehľadnosti výkresu sú v tlačenej forme čísla väčšiny podrobných bodov vypnuté.

Kraj:	Trnavský	Zameral:	Alex Kizek	EUROVIA
Okres:	Galanta	Spracoval:	Alex Kizek	
Katastrálne územie:	Kráľov Brod	Autorizačne overil:	Ing. Svelozár Mocko	

Investor:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava	Určené pod. bodov	TS
Stavba:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod	Určené PBPP	TS
Objekt:	SO - 02 most M999	Výškový systém	B.p.v.
Názov prílohy:	Výškopisné zameranie výkopov	Súradnicový systém	JTSK
		Zákazkové číslo	382025
		Dátum	22.2.2026
		Mierka	1:50
		Stupeň	VÝKRES
		VP	1

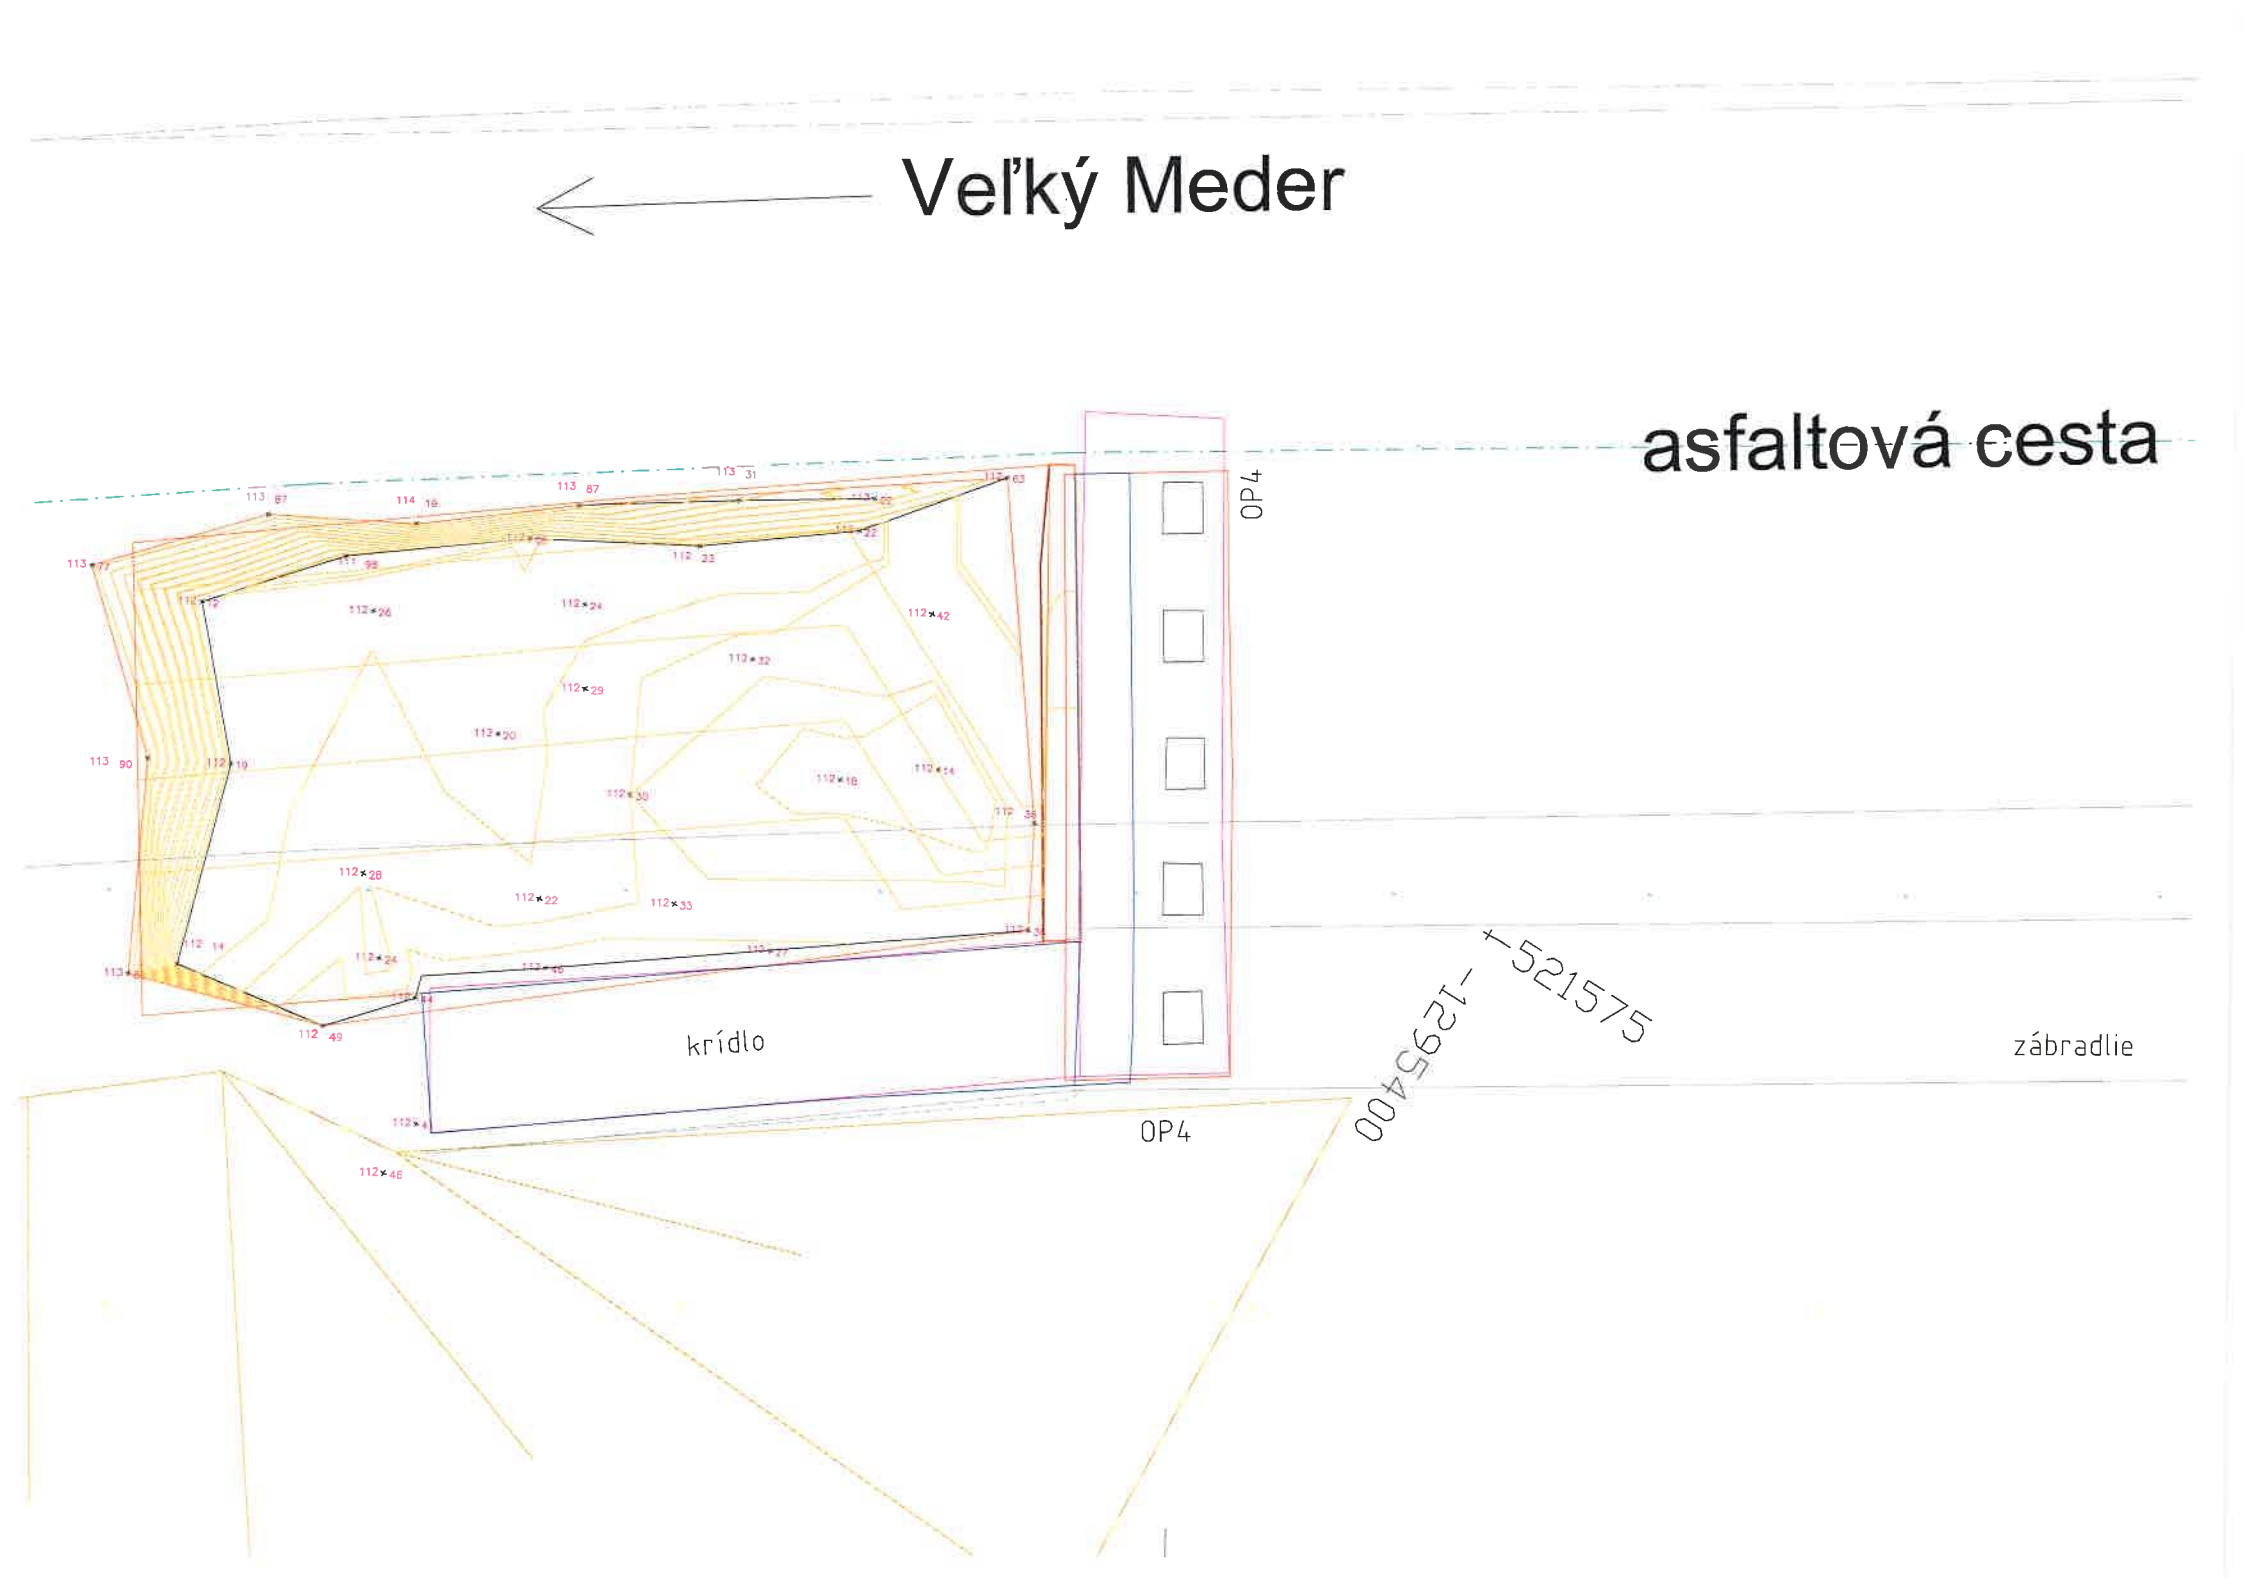
Veľký Meder
asfaltová cesta
OP4
krídlo
OP4
zábradlie
-521575
-1295400

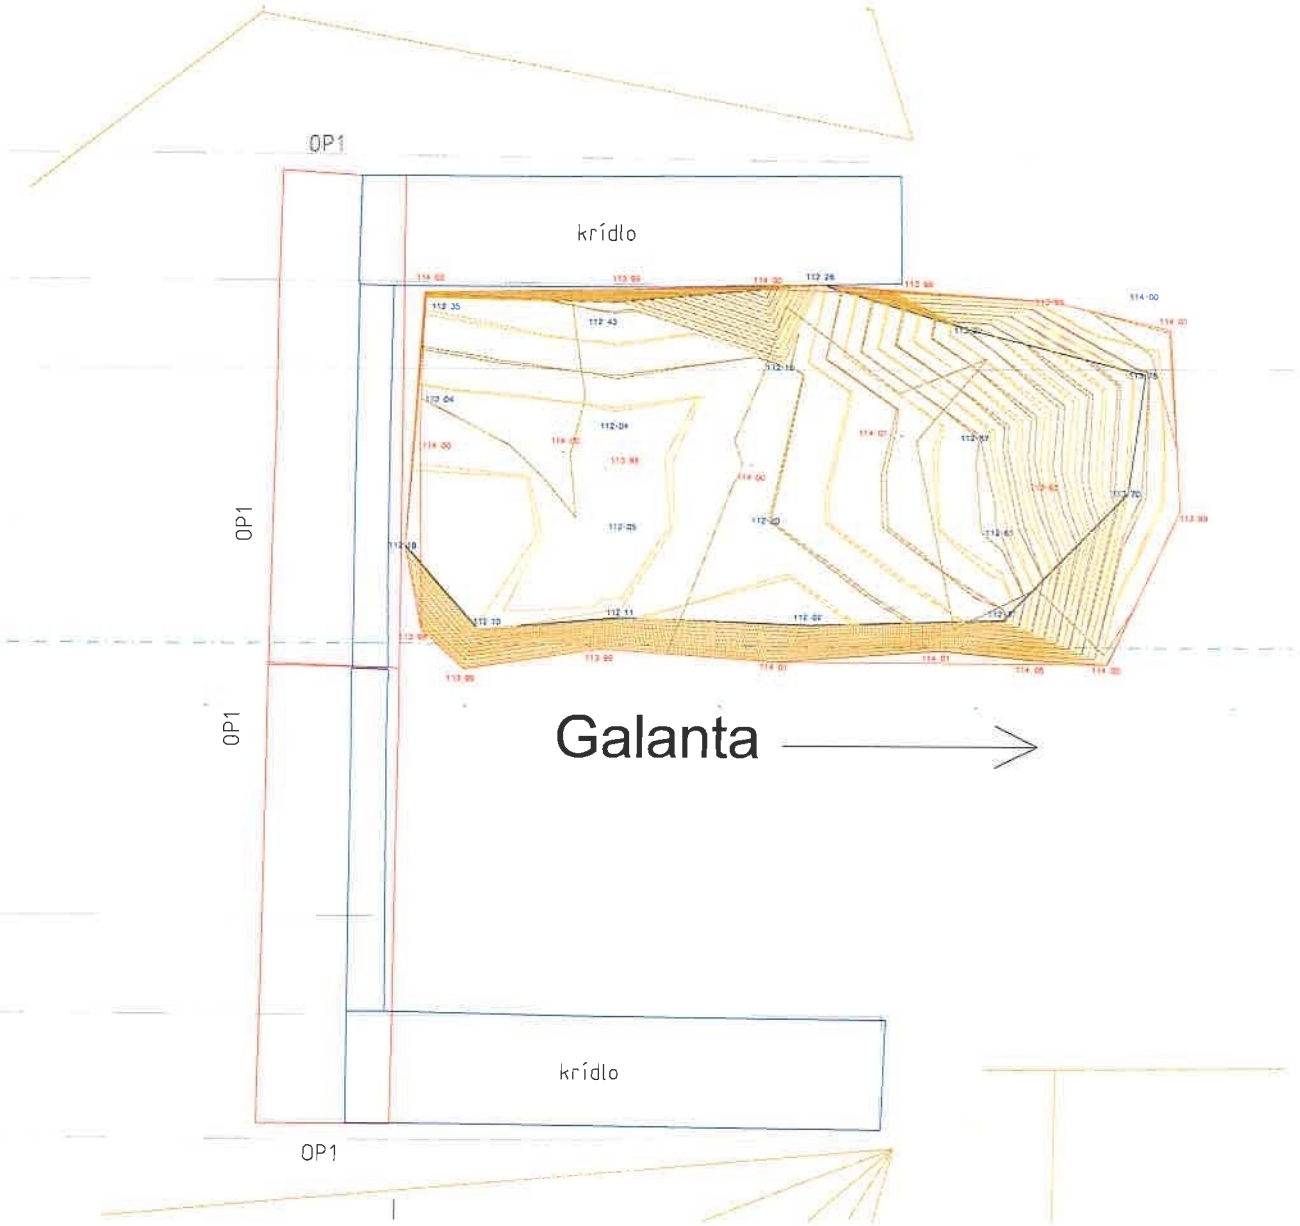

Legenda :			
Liniové prvky :		Liniové prvky :	
	pôvodný stav pilierov		vrch úložného prahu
	vrch krídiel a záverných múrikov		vrch prechodovej kapsy
	zarezanie		úložné bločky
	stredová os komunikácie		pôvodný stav komunikácie
	kraj vodného toku		terénna hrana
Bodové prvky :			
113 08	meraný pod.bod - spodná vrstva jamy		
113 08	meraný pod.bod - vrchná vrstva jamy		
×	lomový bod, podrobný bod-kríž		
+	kríž hektometrickej siete		

Objemy výkopov prechodových častí OP1 a OP4 (jamy):			
OP4	Plocha sp.časti: 22,98m2	Plocha hor.časti: 40,76m2	Objem: 56,23m3
OP1	Plocha sp.časti: 29,83m2	Plocha hor.časti: 37,44m2	Objem: 51,93m3

PODPIS:


Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.

Dátum: 2.09.2026

Kraj:	Trnavský	Zameral:	Alex Kizek
Okres:	Galanta	Spracoval:	Alex Kizek
Katastrálne územie:	Kráľov Brod	Autorizačne overil:	Ing. Svetozár Mocko

EUROVIA

Investor:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava	Určenie podr. bodov	TS
		Určenie PBPP	TS
		Výškový systém	B.p.v.
Stavba:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod	Súradnicový systém	JTSK
		Zákazkové číslo	352026
		Dátum	2.09.2026
Objekt:	SO - 02 Rekonštrukcia mosta M999	Mierka	1:50
		Stupeň	VYKRES
Názov prílohy:	Polohopisno-výškopisné zameranie výkopov	PVP	2

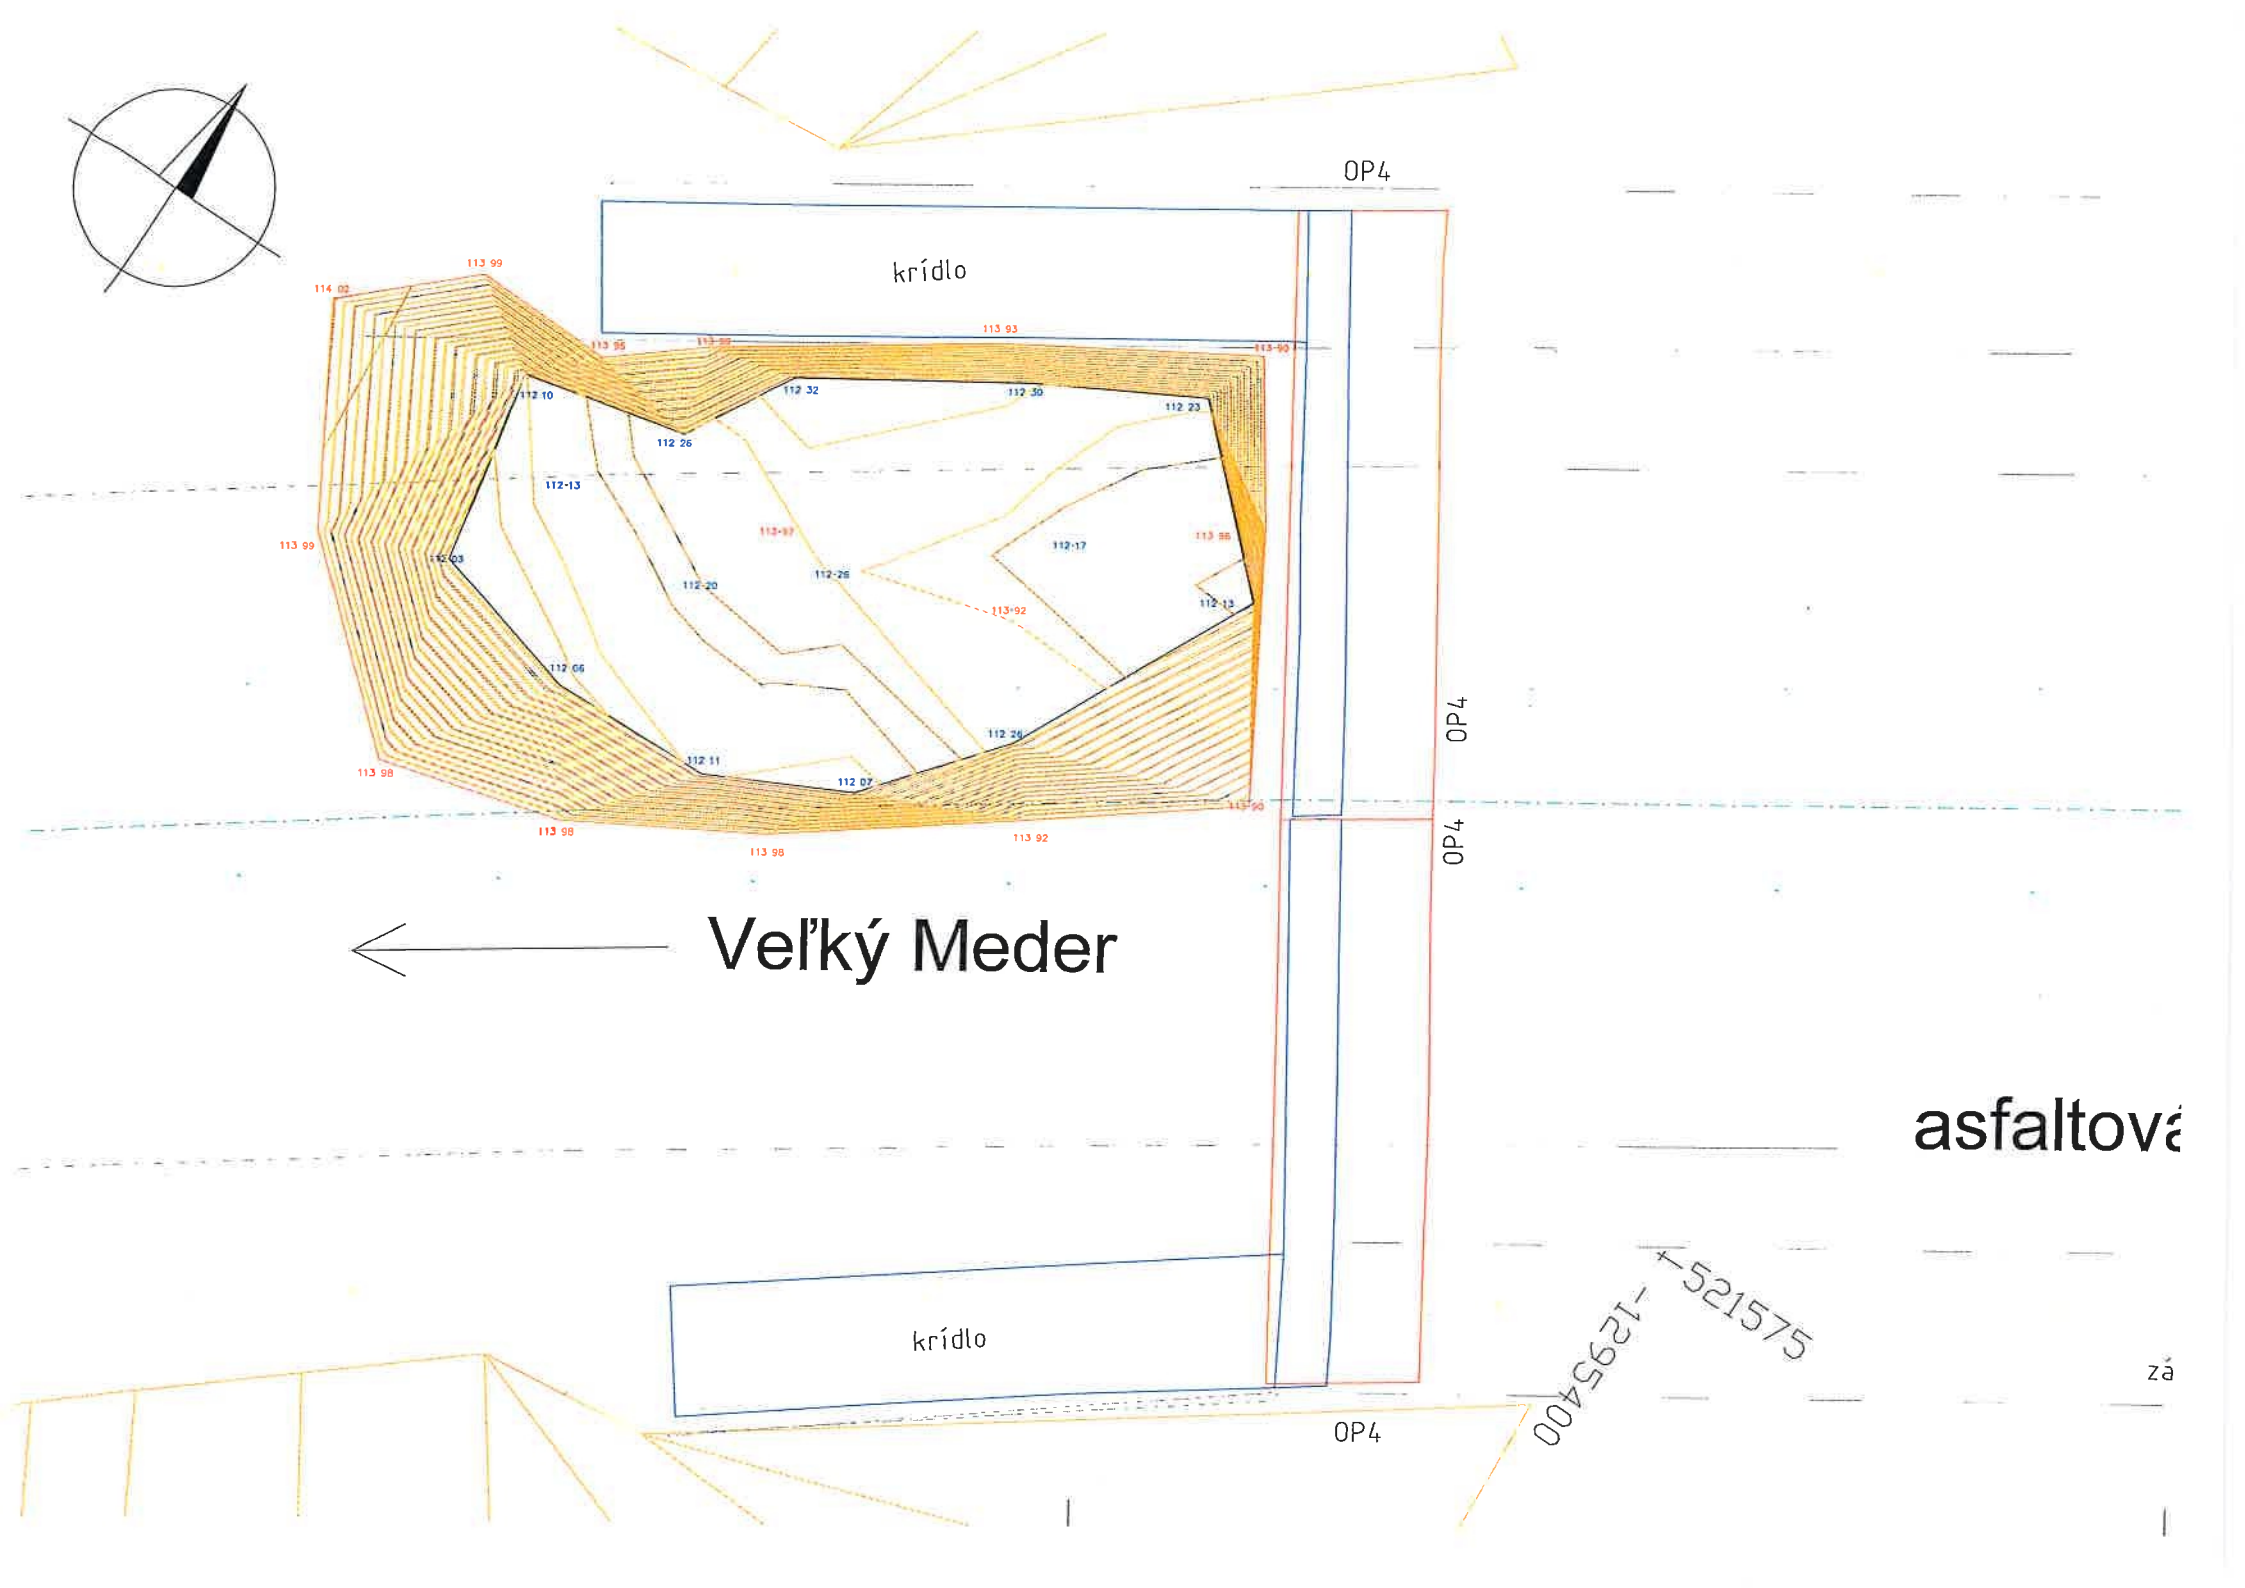
OP4
krídlo
113 99
114 02
113 93
113 95
113 90
112 10
112 32
112 30
112 23
112 26
112-13
113 99
112-17
113 96
112-20
112-26
113 92
112-13
112 06
112 26
112 11
112 07
113 98
113 98
113 98
113 92
OP4
OP4
Veľký Meder
asfaltová
krídlo
OP4
-1295400
521575
zá

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: **44/2025/SÚCTt**

Poradové číslo zmenového listu: 11

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 01 - Pozemné komunikácie

Názov zmeny: Výmena podložia SO 01

Popis zmeny: Predmetom zmeny je výmena nevyhovujúceho podložia SO 01 v hrúbke 0,80 m pod úrovňou zemnej pláne. Po odstránení pôvodných konštrukčných vrstiev vozovky a odkope v rozsahu podľa projektovej dokumentácie boli na upravenej a zhutnenej zemnej pláni vykonané statické zaťažovacie skúšky. Výsledky skúšok preukázali nedostatočnú únosnosť podložia, na základe čoho Stavebný dozor vydal pokyn na jeho výmenu.

Zdôvodnenie zmeny: Potreba výmeny podložia vznikla na základe skutočne zistených geotechnických podmienok po odkrytí zemnej pláne. Statické zaťažovacie skúšky preukázali, že podložie nespĺňa požadovaný modul pretvárnosti Edef2 = 90 MPa.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 11

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD:	áno/nie
Harmonogram prác:	áno/nie
Cenu za Dielo:	áno/nie

Zvýšenie o:	33 281,65 €	bez DPH
	40 936,43 €	s DPH

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny:

SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ na základe nevyhovujúcich výsledkov statických zaťažovacích skúšok a pokynu Stavebného dozoru realizuje výmenu nevyhovujúceho podložia SO 01 za účelom dosiahnutia požadovanej únosnosti zemnej pláne a uplatňuje si nárok na úhradu nákladov spojených s vykonaním týchto dodatočných prác.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 22.10.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 11

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	j. cena	Cena celkom
			Odpočty				
			Prípočty				
			I. ETAPA				
	9	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	145,99	23,59	3 443,90
	11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	145,99	20,93	3 055,57
	23	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	522,26	20,12	10 507,87
	23A	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s roszprestretím a zhutnení, po zhutnení hr. 250mm	m2	73,54	17,64	1 297,25
		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zeminy a kamenivo (17 05)	t	321,18	14,55	4 673,17
			II. ETAPA				
	9	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	63,3	23,59	1 493,25
	11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,3	20,93	1 324,87
	23	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	271,35	20,12	5 459,56
		171209002.S	Poplatok za skladovanie - zeminy a kamenivo (17 05)	t	139,26	14,55	2 026,23

Spolu 33 281,65

Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 11**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	


Poznámky:

Prílohy k ZL:

Príloha č.1 - Geodetický protokol

Príloha č.2 - Položkový výpočet

Príloha č.3 - Rozbor ceny materiálu 63-125

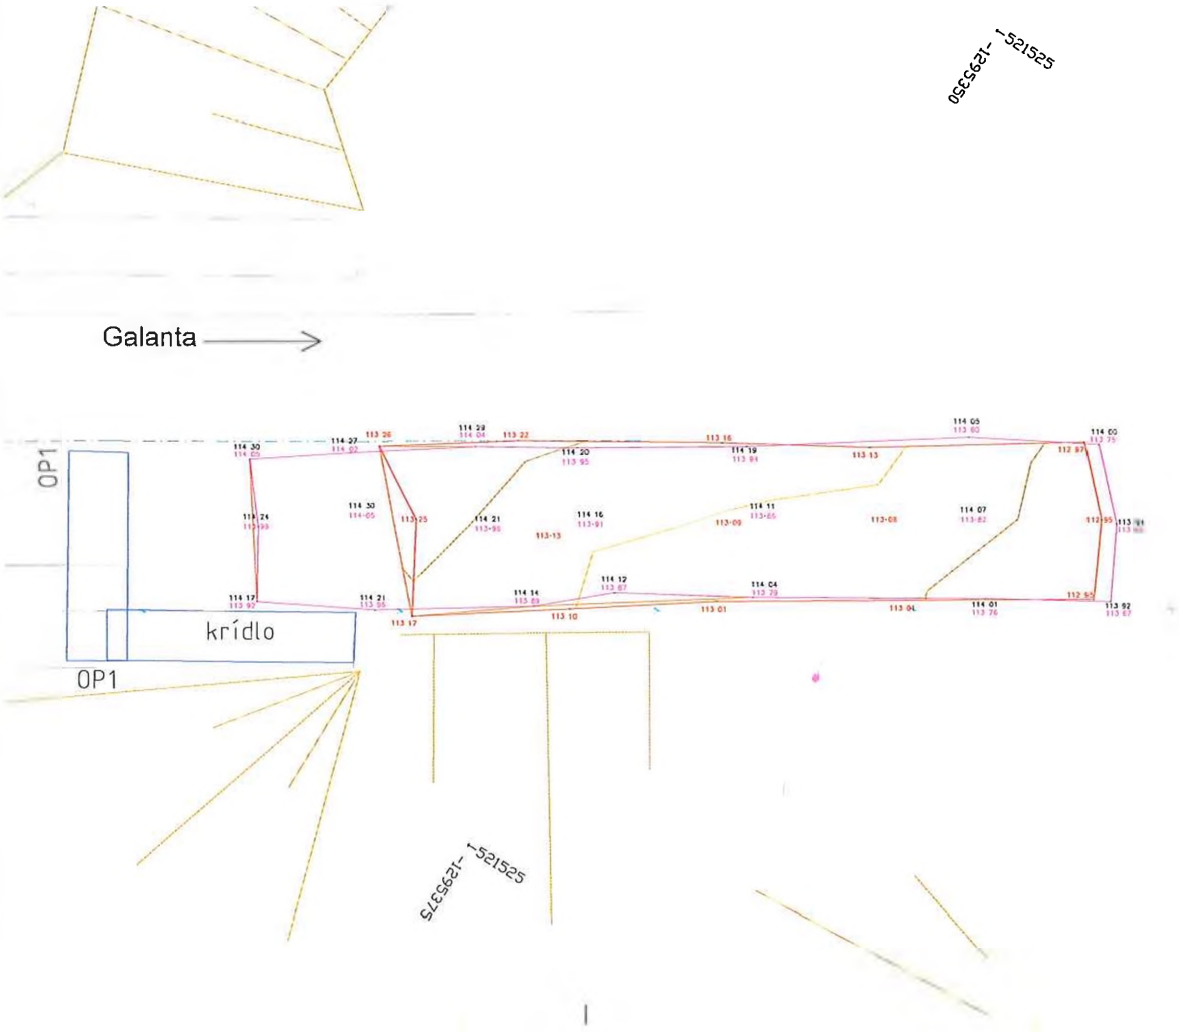
Galanta
OP1
krídlo
OP1

Legenda :			
Bodové prvky :		Liniové prvky :	
113 08	meraný pod.bod - vrch štrkodrvy hr.25		pôvodný stav (komunikácia,plôtere,oši..)
113 09	meraný pod.bod - spodok štrkodrvy hr.25		hrana opár
113 08	meraný pod.bod - spodok štrkodrvy hr.70-80		stredová os komunikácie
×	lomený bod, podrobný bod-kríž		hrana vrchu krídel
+	kríž heklometrickej siete		terénna hrana
			plocha štrkodrviny (hr.25cm)
			plocha štrkodrviny (hr. 70-80 cm)

Objemy položenej štrkodrviny hr. do 25cm (pred skúškou):			
OP4	Plocha sp.časti: 144,56m2	Plocha hor.časti: 144,56m2	Objem: 36,32m3
OP1	Plocha sp.časti: 87,88m2	Plocha hor.časti: 87,88m2	Objem: 22,21m3
Objemy položenej štrkodrviny hr. 70-80cm (po skúške - naviac odkopávanie):			
OP4	Plocha sp.časti: 125,06m2	Plocha hor.časti: 126,32m2	Objem: 91,28m3
OP1	Plocha sp.časti: 73,54m2	Plocha hor.časti: 73,01m2	Objem: 54,73m3


PODPIS:

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.


Dátum: 1.5.2026

Kraj:	Trnavský	Zameral:	Alex Kizek	EUROVIA
Okres:	Galanta	Spracoval:	Alex Kizek	
Katastrálne územie:	Kráľov Brod	Autorizačne overil:	Ing. Svetozár Mocko	

Investor:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava	Určenie podr. bodov	TS
		Určenie PEPP	TS
		Výškový systém	B.p.v.
Stavba:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod	Súradnicový systém	JTSK
		Základná čísla	05/2026
		Dátum	1.5.2026
Objekt:	SO - 01 Rekonštrukcia cesty mosta M999	Mierka	1:100
		Stupeň	VÝKRES
Názov prílohy:	Polohopisno-výškopisné zameranie výkopov	PVP	1

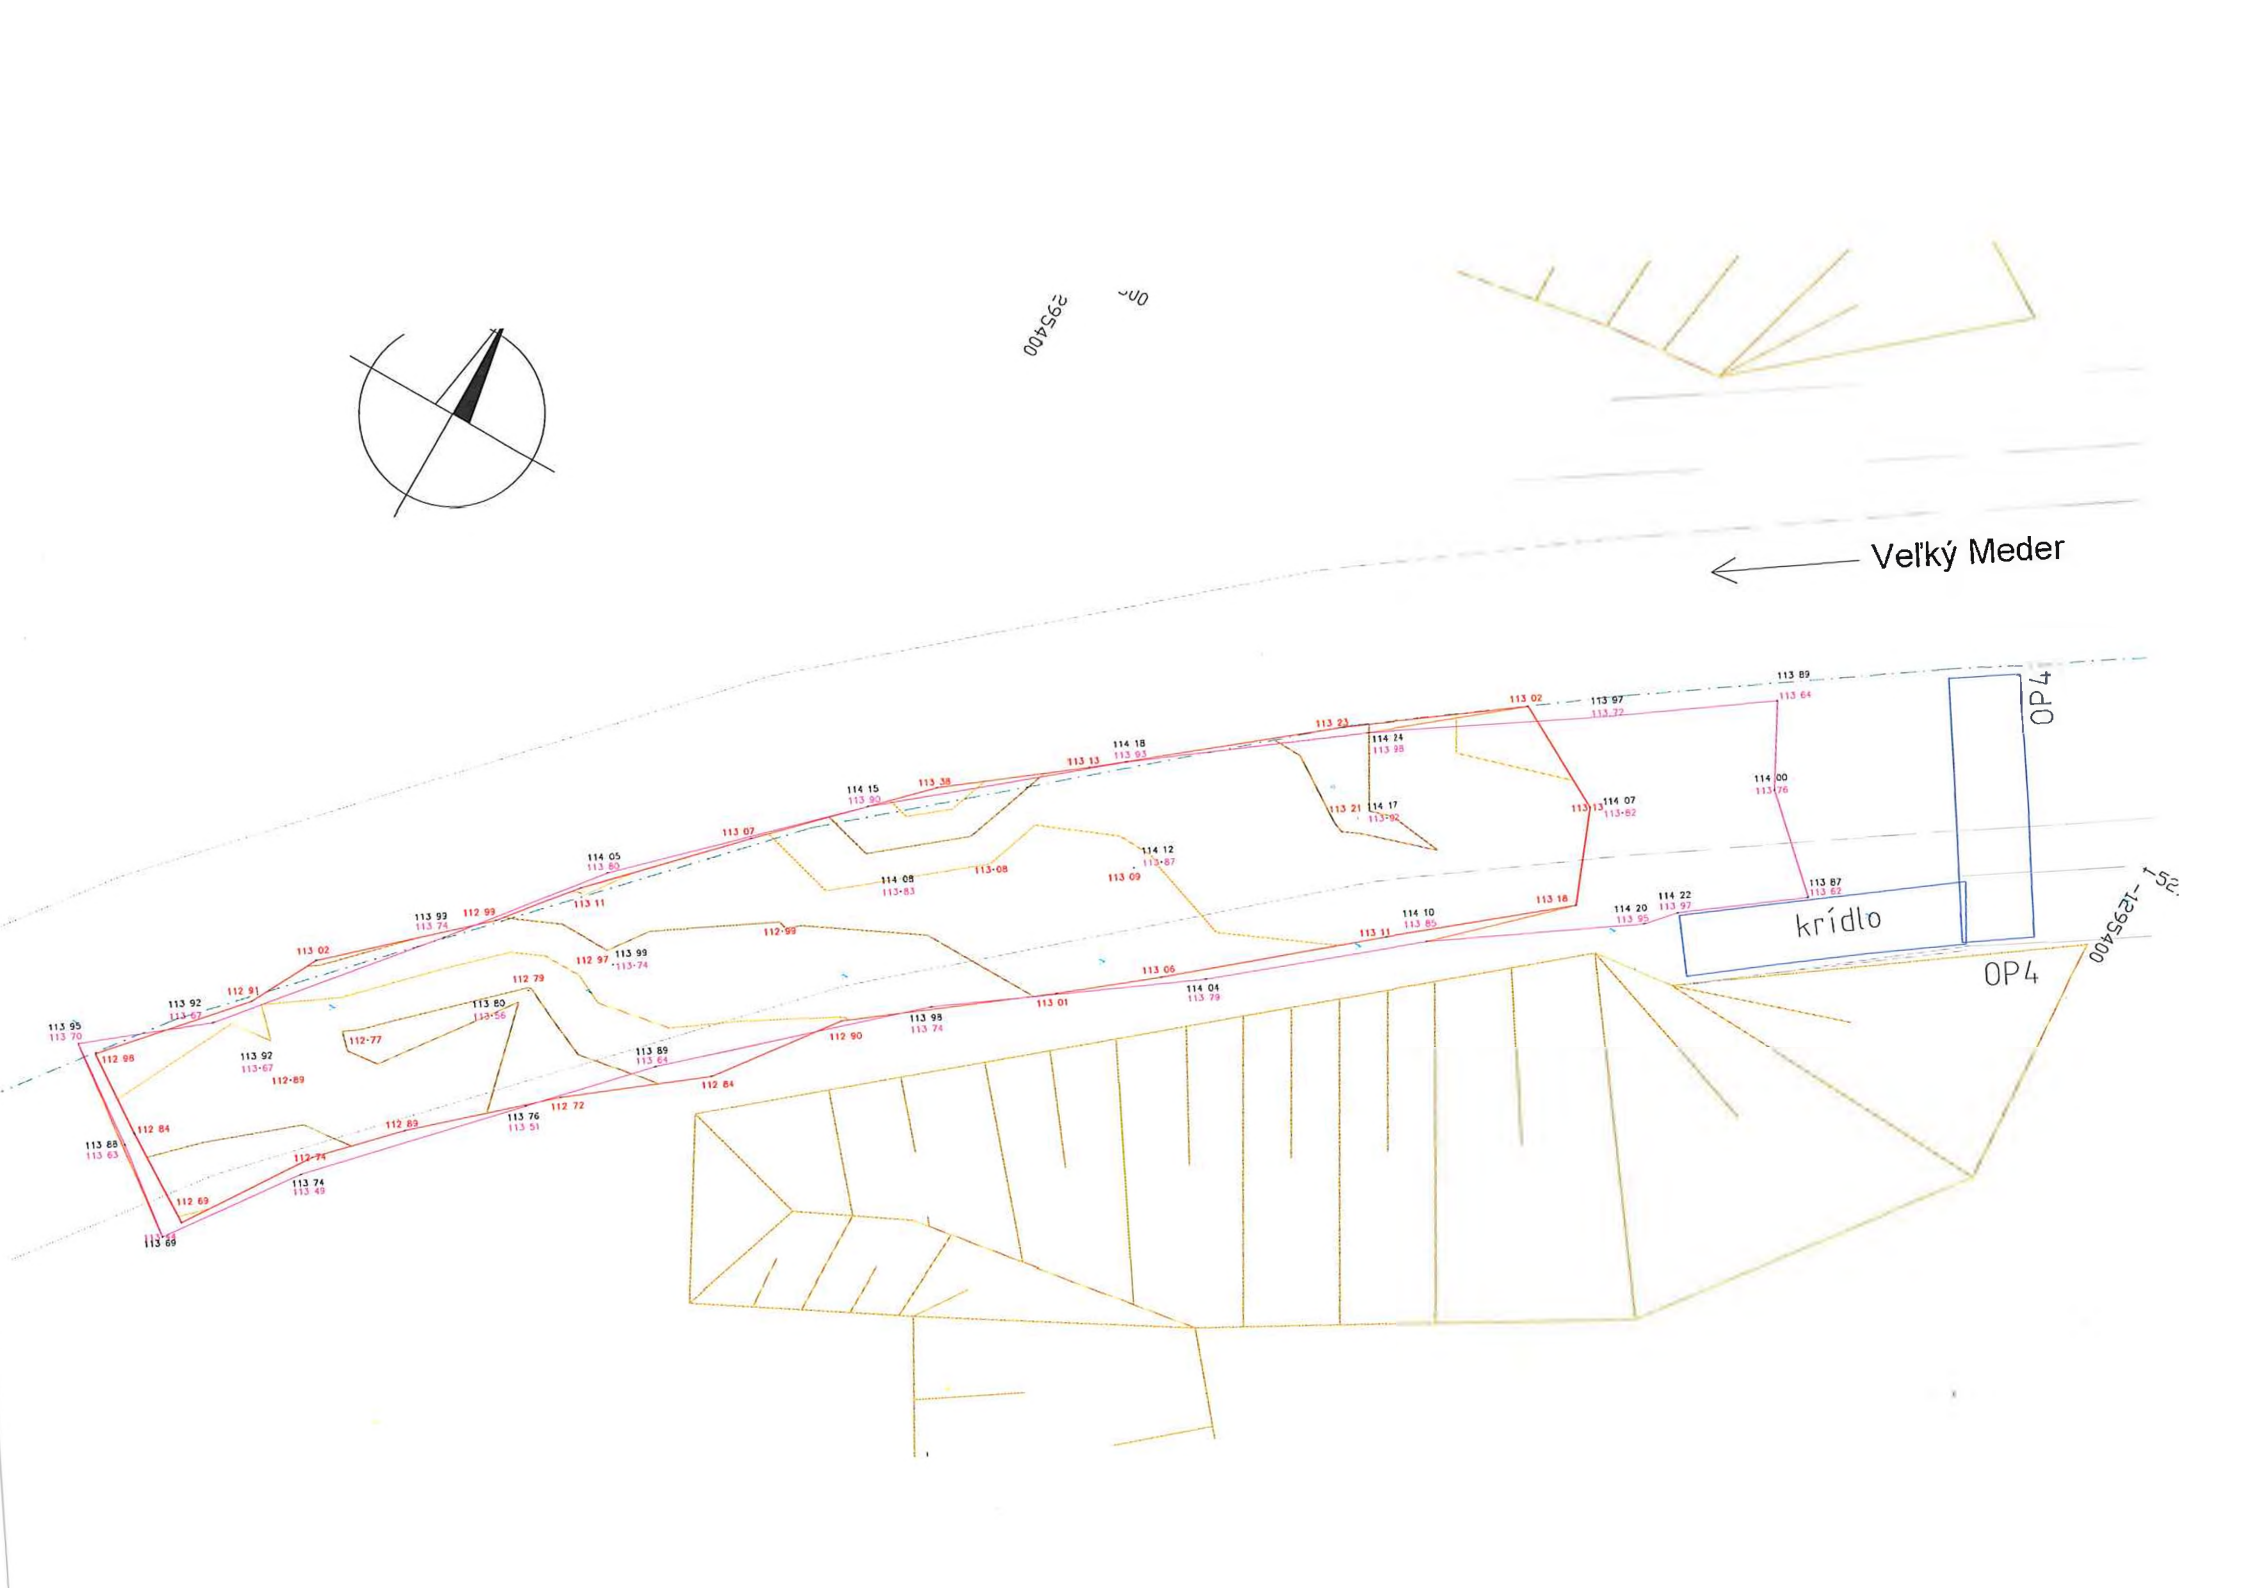
Veľký Meder
krídlo
OP4
OP4

II. ETAPA

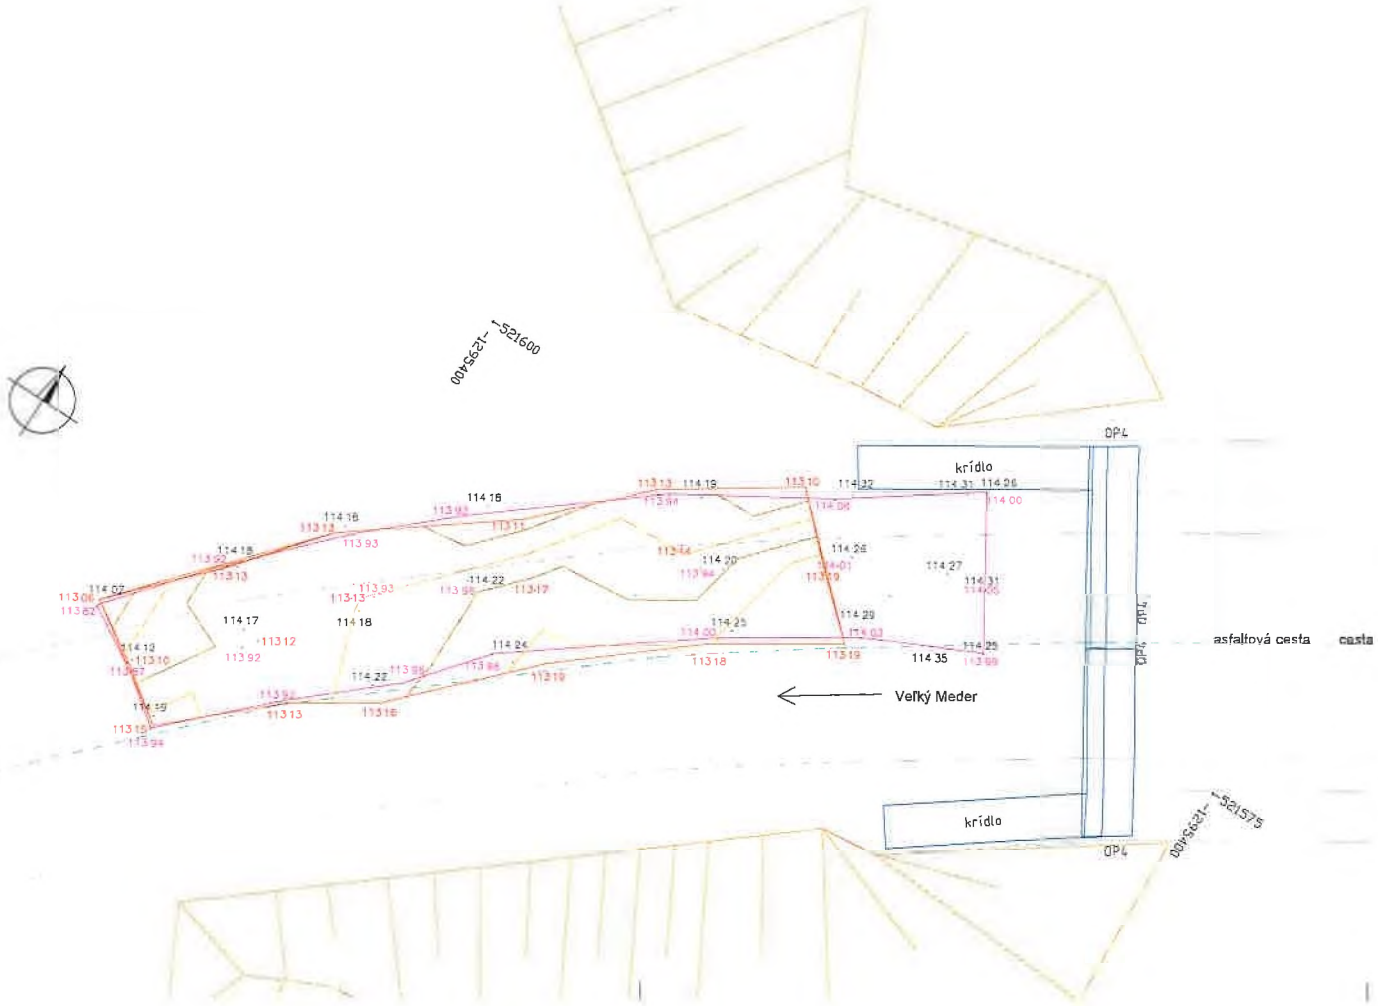

Legenda :			
Bodové prvky :		Líniové prvky :	
113.08	meraný pod.bod - vrch štrkodrviny hr.25 cm		súvodný stav (komunikácia,zábery,ost...)
113.08	meraný pod.bod - spodok štrkodrviny hr.25 cm		hrana opôr
113.08	meraný pod.bod - spodok štrkodrviny hr.50 cm		stredová os komunikácie
×	lomový bod, podrobný bod-kútik		hrana vrchu krídel
+	kríž geodetickej siete		terénna hrana
			plocha štrkodrviny (hr.25cm)
			plocha štrkodrviny (hr.50 cm)

Objemy položenej štrkodrviny hr. do 25cm (pred skúškou)

OP4	Plocha po zárez: 165,83m2	Plocha hor.časť: 154,19m2	Objem: 25,78m3

Objemy položenej štrkodrviny hr. 50 cm (po skúške - nevasc.odkopávkami)

OP4	Plocha po zárez: 95,45m2	Plocha hor.časť: 87,30m2	Objem: 67,42m3

Přehled výkopů a násypů

Název	Faktor výkopu	Faktor násypu	Zj plocha	Výkop	Násyp	Celková kubatura
objekt_strk25_A	1.000	1.000	103,02m2	25,75 m3	0.00 m3	25,75 m3<Výkop>
Celkem součty:			103,02m2	25,75 m3	0,00 m3	25,75 m3<Výkop>

Přehled výkopů a násypů

Název	Faktor výkopu	Faktor násypu	Zj plocha	Výkop	Násyp	Celková kubatura
objekt_40cm	1.000	1.000	83,96m2	67,42 m3	0.00 m3	67,42 m3<Výkop>
Celkem součty:			83,96m2	67,42 m3	0,00 m3	67,42 m3<Výkop>

PODPIS:


Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom

Kraj:	Trnavský	Zameral:	Alex Kizek
Okres:	Galanta	Spracoval:	Alex Kizek
Katastrálne územie:	Kráľov Brod	Autorizačne overil:	Ing. Svetozár Mocko

EUROVIA

Investor:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
Stavba:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod
Objekt:	SO - 01 Rekonštrukcia cesty mosta M999
Názov prílohy:	Polohopisno-výškopisné zameranie výkopov

Mierka pôdorys:	1:50
Mierka profilov:	1:50
Výškový systém:	B.p.v.
Súradnicový systém:	S-JTSK
Súradnicový pás:	5 (S-5)
Dátum:	20.10.2021
Kreslil:	I. Hič
Stupeň:	VÝKRES
PVP	1

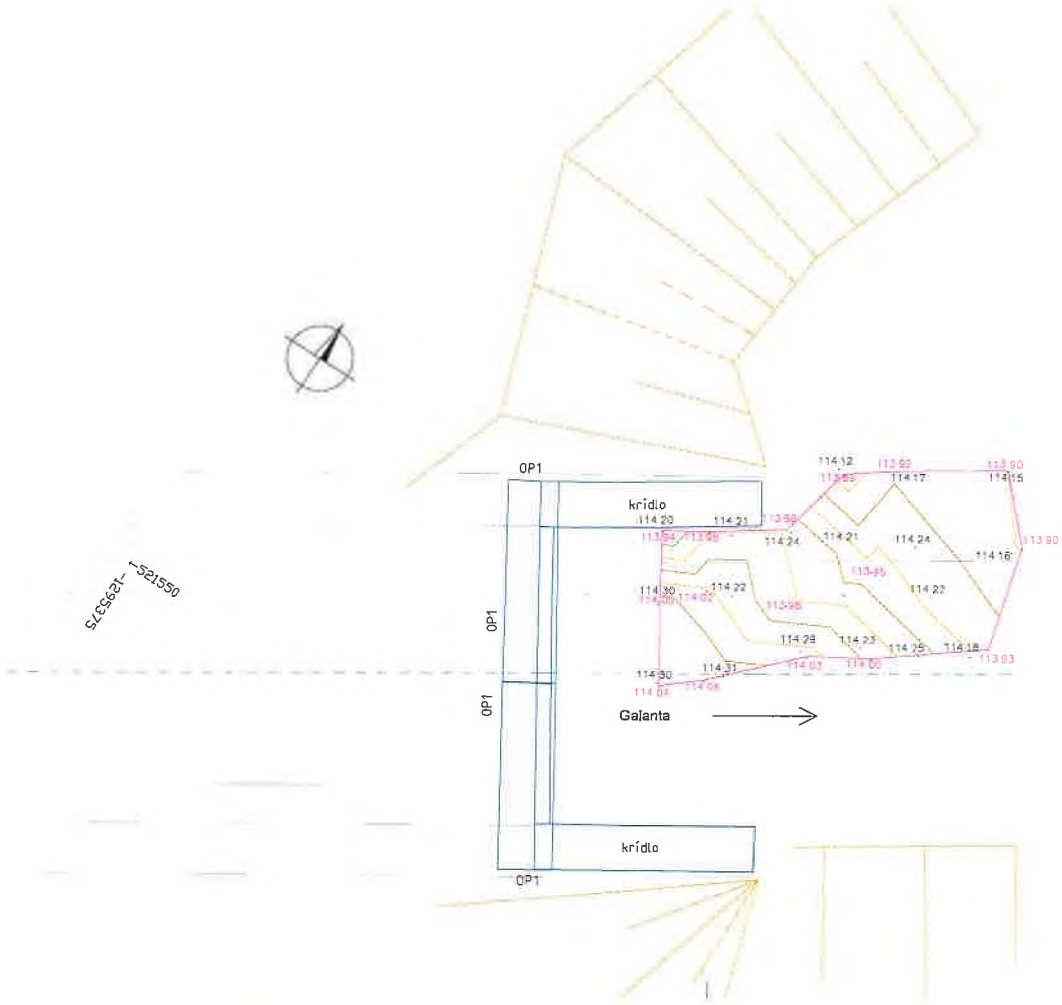
OP1
krídlo
114.20
114.21
114.12
113.92
113.90
114.17
114.15
114.24
114.16
113.95
114.22
114.23
114.29
114.23
114.25
114.18
113.93
114.30
114.31
114.03
114.00
114.04
114.06
OP1
OP1
Galanta
krídlo
OP1
1521550
1259375

Legenda :			
Bodové prvky :		**Líniové prvky :**	
113 05	meraný pod.bod - vrch štrkodrvy hr.25 cm		**odvodný stav (komunikácia,chodník,ge...)**
113 05	meraný pod.bod - spodok štrkodrvy hr.25 cm		**hrana opěr**
113 05	meraný pod.bod - spodok štrkodrvy hr.50 cm		**stredová os komunikácie**
×	**lomový bod, podrobný bod-križ**		hrana vrchu krídel
+	kríž hektometrickej siete		terénna hrana
			plocha štrkodrviny (hr.25cm)
			plocha štrkodrviny (hr.50 cm)

0521525 -1293550

OP1

Přehled výkopů a násypů

Název	Faktor výkopu	Faktor násypu	2D plocha	Výkop	Násyp	Celková kubatura
objem_strk25_D	1.000	1.000	45.49m2	11.37 m3	0.00 m3	11.37 m3<Výkop>
Celkové součty			45.49m²	11.37 m³	0.00 m³	11.37 m³<Výkop>

PODPIS:

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.

Dátum: 26.10.2026

Kraj:	Trnavský	Zameral:	Alex Kizek	EUROVIA
Okres:	Galanta	Spracoval:	Alex Kizek	
Katastrálne územie:	Králov Brod	Autorizačne overil	Ing. Svetozár Mocko	

Investor:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava	Dátum pod. podkl.	10
		Súradnicový systém	TB
		Výškový systém	Bpv
Stavba:	Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste III/561 v obci Králov Brod	Súradnicový systém	JTSK
		Zmluvné číslo	25/2026
		Dátum	26.10.2026
Objekt:	SO - 01 Rekonštrukcia cesty mosta M999	Mierka	1 : 100
		Stupeň	VÝKRES
Názov časti diela:	Polohopisno-výškopisné zameranie výkopov	PVP	2

Stavba: **Rekonštrukcia mosta M999 v KM 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, Okres Galanta**
Objekt: **SO 01 - Rekonštrukcia cesty**

Podrobný prepočet výmeny podložia

Nové jednotkové ceny a cenový dopad pre I. a II. Etapu

I. ETAPA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	plocha (m2)	počet vrstiev	Celková výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámka
9	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	145,99			23,59	3 443,90	
			Odkop podložia, krajnice v mieste novej konštrukcie vozovky typu 2 po úroveň pláne, rozsah v zmysle PD							
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	145,99			20,93	3 055,57	
			Odvoz výkopového materiálu na skládku							
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	73,54	2	147,08	20,12	2 959,25	za OP1
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	125,06	3	375,18	20,12	7 548,62	za OP4
23A		564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s roszprestretím a zhutnení, po zhutnení hr. 250mm	m2	73,54	1	73,54	17,64	1 297,25	za OP1
			Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD							
	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zeminy a kamenivo (17 05)	t	321,18			14,55	4 673,14	
									22 977,74	

II. ETAPA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	plocha (m2)	počet vrstiev	Celková výmera	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámka
9	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	63,30			23,59	1 493,25	
			Odkop podložia, krajnice v mieste novej konštrukcie vozovky typu 2 po úroveň pláne, rozsah v zmysle PD							
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,30			20,93	1 324,87	
			Odvoz výkopového materiálu na skládku							
23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	90,45	3	271,35	20,12	5 459,56	
			Nová konštrukcia vozovky, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD							
	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zeminy a kamenivo (17 05)	t	139,26			14,55	2 026,23	
									10 303,91	

Spolu I. a II. Etapa **33 281,65**

Rozbor ceny

Položka	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutneni hr. 250 mm	
TOV	000	TOV 000	MJ m2

H	Priamy materiál				11,78
P	Mzdové náklady + doplnkové mzdy				0,93
O	Odvody	0,0	% z miezd		0,00
S	Stroje				0,30
T	Ostatné priame náklady				0,00
SUB	Poddodávky				0,00
PSN	**Priame spracovacie náklady**	[P] + [O] + [S] + [T]			**1,23**
	Priame náklady	[H] + [SUB] + [PSN] + [NK]			**13,01**
R1	VR	13,00	% z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		1,69
R2	SR	16,34	% z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		2,13
R3	Réžia 3	0,00	% z []		0,00
	Nepriame náklady	[R1] + [R2] + [R3]			**3,82**
	Náklady celkom	[H] + [SUB] + [PSN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			**16,83**
Z	Zisk	6,26	% z [NC]+[D]+[P]+[O]+[S]+[T]		0,81
R4	Réžia 4	0,00	% z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady				0,00
	Celkom	[H] + [SUB] + [PSN] až [NK]			**17,64**
	Jednotková cena				**17,64**
	Hmotnosť				0,57500
	Normohodiny				0,046

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,05000	1,40	0,07
2	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 63-125 mm	t	0,48090	24,35	11,71
			Materiály				**11,78**
4	P	7119999-T-1	Stavebný pracovník	Nh	0,03330	20,00	0,67
5	P	8332000-T-31	Vodič motorového vozidla - 1. stupeň náročnosti	Nh	0,00012	20,00	0,00
6	P	8342001-T-22	Operátor stavebných strojov - 2. stupeň náročnosti	Nh	0,01300	20,00	0,26
			Mzdy				**0,93**
8	S	010431180800	Rýpadlo-nakladač na traktorovom podvozku objem lopaty 0,24/1,1 m3, max. dosah 6,	Sh	0,00190	28,32	0,05
11	S	043153510300	Valec vibračný motorový hladký 15,7 t, šírka valca 2,3 m	Sh	0,00490	45,45	0,22
12	S	044153250100	Valec vibračný ručne vedený 1,1 t	Sh	0,00070	4,26	0,00
13	S	101531019600	Automobil kropiaci 7 m3	Sh	0,00050	35,07	0,02
14	S	104154009600	Nákladný automobil sklápač 208 kW, objem 8 m3, nosnosť 11 t	Sh	0,00011	44,18	0,00
			Stroje				**0,30**

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: **44/2025/SÚCTt**

Poradové číslo zmenového listu: 12

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 01 - Pozemné komunikácie

Názov zmeny: Zmena asfaltov SO 01

Popis zmeny: Predmetom zmeny je úprava skladby asfaltových vrstiev SO 01 oproti projektovej dokumentácii stupňa DRS, ktorá bola podkladom pre stanovenie rozsahu a ceny Diela. Pôvodne navrhnutá obrusná vrstva AC 11 O z nemodifikovaného asfaltu hr. 40 mm bola v DVP zmenená na AC 11 O z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm. Pôvodná vrstva AC 16 z nemodifikovaného asfaltu hr. 60 mm bola zmenená na AC 16 L z nemodifikovaného asfaltu hr. 70 mm.

Zdôvodnenie zmeny: Potreba realizácie zmenených asfaltových vrstiev vznikla v dôsledku zmeny projektového riešenia v dokumentácii stupňa DVP oproti dokumentácii stupňa DRS, ktorá bola podkladom pre ocenenie Diela. Zmenou došlo jednak k použitiu modifikovaných asfaltových zmesí namiesto pôvodne navrhovaných nemodifikovaných zmesí a zároveň k navýšeniu hrúbky oboch asfaltových vrstiev o 10 mm. Uvedené práce a zvýšené náklady neboli zahrnuté v pôvodnom zmluvnom rozsahu a ich potreba nevznikla pričinením Zhotoviteľa.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 12

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD: áno/nie

Harmonogram prác: áno/nie

Cenu za Dielo: áno/nie

Zvýšenie o:	7 073,65 €	bez DPH
	8 700,59 €	s DPH

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny:

SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ realizuje asfaltové vrstvy SO 01 v súlade s projektovou dokumentáciou stupňa DVP a uplatňuje si nárok na úhradu rozdielu nákladov vzniknutého zmenou druhu asfaltových zmesí a hrúbok jednotlivých vrstiev oproti riešeniu nacenenému v súťaži.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 22.10.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 12

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	J. cena	Cena celkom
			Odpočty				
	30	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	643,25	20,84	- 13 405,33
	31	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	653,22	24,22	- 15 820,99
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
			Prípočty				
	30A	577144261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 11 O v ruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	643,25	27,74	17 842,15
	31A	577164351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	653,22	28,26	18 457,82

Spolu **7 073,65**

Stavba: **Rekonštrukcia mosta M999 v KM 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, Okres Galanta**

Objekt: **SO 01 - Rekonštrukcia cesty**

Nové jednotkové ceny a cenový dopad pre I. a II. Etapu

PČ	Kód	Popis	MJ	J.C. 60mm	J.C 10 mm	Nová J.C. 70mm - nemodifikovaný
31	577154341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	24,22	4,04	**28,26**

PČ	Kód	Popis	MJ	J.C. 40mm	J.C 10 mm	Nová J.C. 50mm - modifikovaný
58	577134261.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	22,19	5,55	**27,74**

ZMENOVÝ LIST

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Číslo ZoD: **44/2025/SÚCTt**

Poradové číslo zmenového listu: 13

Zmena:

D - dokumentácia	x
P - príprava	
R - realizácia	x

Stavebný objekt: SO 01, SO 02

Názov zmeny: Daň za vydobyté primárne suroviny

Popis zmeny: Predmetom Zmenového listu je zohľadnenie dopadu zmeny legislatívy Slovenskej republiky na zmluvnú cenu diela a harmonogram výstavby. Dňa 24. septembra 2025 bol prijatý zákon č. 261/2025 Z. z. (účinný od 1. apríla 2026), ktorým sa dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

Zdôvodnenie zmeny: V čase predkladania ponuky a podpisu Zmluvy o dielo (18.06.2025) nemohol zhotoviteľ predvídať prijatie zákona č. 261/2025 Z. z., ani zahrnúť nový poplatok za primárne suroviny do pôvodných jednotkových cien. Ide o novú zákonnú povinnosť vyvolanú štátom, pričom zvýšenie obstarávacích cien vstupných surovín a produktov z nich vyrobených má priamy nepriaznivý finančný dopad na zhotoviteľa.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 13

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Dopady na:

Dielo/PD:	áno/nie
Harmonogram prác:	áno/nie
Cenu za Dielo:	áno/nie

Zvýšenie o:	1 848,90 €	bez DPH
	2 274,15 €	s DPH

Zníženie o:	bez DPH
	s DPH

Zdroj financovania

Navrhovateľ zmeny:

SMS a.s.

Podpis:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zhotoviteľ spracoval a ocenil Zmenový list na základe porovnania pôvodných zmluvných jednotkových cien a preukázateľne zvýšených obstarávacích cien surovín od dodávateľov (kamenivo, štrkopiesky, asfaltové a betónové zmesi) násobených skutočne zabudovaným množstvom surovín dotknutých touto legislatívnou zmenou.

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozora/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko:

Dátum: 22.10.2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: Ing. Oliver Sliacky - stavbyvedúci

v. r.

Za autorský dozor/dohľad: Ing. Martin Hajdóny

v. r.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta

Zmenový list č.: 13

Stavebný objekt: SO 02 - Rekonštrukcia mosta

Číslo ZoD: 44/2025/SÚCTt

Práce naviac - rozpočet

Zdroj ceny	P.Č	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	J. cena	Cena celkom
Odpočty							
			NOVÉ POLOŽKY - doplnené				
Prípočty							

Poznámka: Presné vyčíslenie zmenového listu je vyčíslené v prílohe č.1

Spolu 1 848,90

Stavba:	**Rekonštrukcia mosta M999 v km 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, okres Galanta**	**Zmenový list č.: 13**
Stavebný objekt:	**SO 02 - Rekonštrukcia mosta**	
Číslo ZoD:	**44/2025/SÚCTt**	

Poznámky:

Prílohy k ZL:

Príloha č.1 - Podrobné vyčíslenie zmenového listu

Stavba: **Rekonštrukcia mosta M999 v KM 16,969 na ceste II/561 v obci Kráľov Brod, Okres Galanta**
Objekt: **SO 01, SO 02**

Podrobný prepočet úhrady za vydobyté primárne suroviny

Betóny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámka	MJ	Zostatok mostva, rok 2026	Prepočet na t (prenásobené koeficientom 1,5)	daň z primárnych materiálov od 1.1.2026 (1,35€/t)	Navýšenie ceny o
16	K	274311117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	m3	13,886	163,07	2 264,39		m3	13,89	20,83	1,35	28,12
20	K	317321119.S	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	41,736	223,88	9 343,86		m3	20,87	31,30	1,35	42,26
24	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	100,800	177,97	17 939,38		m3	50,40	75,60	1,35	102,06
25	K	334323169.S	Mostné bloky ložísk z betónu železového tr. C 35/45	m3	0,693	245,19	169,92		m3	0,35	0,52	1,35	0,70
35	K	421321218.S	Mostné nosná konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	12,240	183,10	2 241,14		m3	6,12	9,18	1,35	12,39
36	K	421321219.S	Spevnenie z betónu železového tr. C 35/45	m3	2,601	192,54	500,80		m3	2,60	3,90	1,35	5,27
37	K	421321239.S	Mostné nosná konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	138,757	202,96	28 162,12		m3	69,38	104,07	1,35	140,49
52	K	452311131.R	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	5,544	151,69	840,97		m3	2,77	4,16	1,35	5,61
53	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	6,046	165,55	1 000,92		m3	3,02	4,53	1,35	6,12

343,02

Štrkodrva

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Poznámka	MJ	Zostatok mostva, rok 2026	Zostatok mostva, rok 2026	daň z primárnych materiálov od 1.1.2026 (1,35€/t)	Navýšenie ceny o
SO 01 - cesta	13	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	66,550			*Zhutnenie zemnej krajnice*	t	66,55	88,15	1,35	89,84
SO 01 - cesta	23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	867,150			*Plocha - naviac práca - výmena podložia*	t	476,93	476,93	1,35	643,86
SO 01 - cesta	23	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	385,330			*Plocha - pôvodný VV - výmena podložia*	t	211,93	211,93	1,35	286,11
SO 01 - cesta	*14*	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*122,100*			*Rozšírenie násypu*	t	122,10	122,10	1,35	164,84
SO 02 - most	*12*	*K*	*174101001.S*	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	*m3*	108,160			*II. Etapa*	t	237,95	237,95	1,35	321,24

1 505,88

Spolu **1 848,90 €**
