

ZMLUVA O DIELO

č. zhot. Z1/2026/044/15

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo:

Bulharská 39, 917 01 Trnava

Zastúpený:

Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zaťková

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

37847783

IČ DPH:

SK 2021777516

neplatiť DPH (iná osoba pre daň podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty)

DIČ:

2021777516

Telefón:

E-mail:

monika.zatkova@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Doprastav, a.s.

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Sídlo:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Zastúpený:

v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.

Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava

Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava

Ing. Peter Majerík, tel. +421 907 801 877

Stavbyvedúci:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

31 333 320

DIČ:

2020372497

IČ DPH:

SK7120000206

Telefón:

02/48271 534

E-mail:

bratislava@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Vzhľadom k tomu, že:

- (A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (*ako je tento pojem definovaný nižšie*), za účelom čoho realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Rekonštrukcia cesty III/1356 – úsek Čierna Voda - Šoriakoš**“, kód IA: C0092;
- (B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania;
- (C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela;

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ

- 1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:
- (a) **Cena za Dielo** znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške **225 723,27 EUR** (slovom: dvestodvadsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťtri eur a dvadsaťsedem eurocentov) **s DPH**, ktorej súčasťou je 23 % DPH vo výške 42 208,42 EUR, t. j. 183 514,85 EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;
 - (b) **Dielo** znamená uskutočnenie prác v zmysle ich popisu v súlade s Projektovou dokumentáciou a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, špecifikovaného v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;
 - (c) **Garančná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **5 % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
 - (d) **Harmonogram prác** znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;
 - (e) **Miesto plnenia** sa nachádza na ceste III/1356 v kkm 10,160 - 10,780 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Začiatok úseku je od križovatky s miestnou/účelovou cestou k štrkovisku Šoriakoš a koniec je na hranici predchádzajúcej rekonštrukcie, nachádza sa v extraviláne, tvorí súvislú trasu a je v celkovej dĺžke 620 m.
 - (f) **Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;
 - (g) **Preberací protokol** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela za podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy;
 - (h) **Preberací protokol staveniska** znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác;
 - (i) **Projektová dokumentácia** znamená projektová dokumentácia vyhotovená v stupni PSO, dátum 03/2026, projektant: Ing. M. Hajdóny, zodpovedný projektant: Ing. M. Zaľková;
 - (j) **Register partnerov verejného sektora** znamená informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese <https://rpvs.gov.sk/rpvs/>;
 - (k) **Reklamácia** znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela;
 - (l) **Subdodávateľ** znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy;
 - (m) **Výkonnostná záruka** znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky **20 % z Ceny za Dielo** v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;
 - (n) **Zákon o odpadoch** znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- (o) **Zmenový list** znamená Zmluvnými stranami podpísaný dokument vo forme určenej Objednávateľom a uvedený v Prílohe 4 Zmluvy ktorého obsahom je evidencia zmeny: (i) Diela, (ii) Ceny za Dielo a/alebo (iii) Harmonogramu prác;
- (p) **Zmluvná strana** znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ; a
- (q) **ZVO** znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,

- (a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nado-búdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;
- (b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií;
- (c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah;
- (d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Zmluvy;
- (e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;
- (f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená kalen-dárny štvrťrok a rok znamená kalendárny rok;
- (g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; a
- (h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzavretí Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo čiastočne na-hradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzavretí Zmluvy.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok:

- (a) Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a
- (b) Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovených Zmluvou.

2.2 Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto položiek bude určená podľa bodu 8.3 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto bodu Zmluvy možno len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.

3 ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC

3.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy:

- (a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku; alebo
- (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu

ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nespĺní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

- 3.2 Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác je do 70 (sedemdesiat) dní odo dňa prevzatia staveniska Objednávateľom v zmysle bodu 4.2 Zmluvy.
- 3.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku na vykonanie prác do výšky Výkonnostnej záruky.
- 3.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác.

4 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle Harmonogramu prác :

- (a) **do 52 dní odo dňa** podpísania Preberacieho protokolu staveniska; alebo
- (b) 2 (dvoch) týždňov odo dňa, ktorý je uvedený v stavebnom denníku ako deň ukončenia stavebných prác;

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v Mieste plnenia stavenisko a podpísať Preberací protokol staveniska Predpokladaný termín odovzdania staveniska v Mieste plnenia je **do 5 (piatich) Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa**, najneskôr však **do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy**.
- 4.3 Objednávateľ dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v Cene za Dielo.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenie pri práci v znení neskorších predpisov.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ je ďalej povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) schémami dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácii, (iii) vydaným určením použitia dočasného dopravného značenia a (iv) povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia.
- 4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny vykonávania Diela v zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v stavebnom denníku potvrdený Zmluvnými stranami.
- 4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ nebude

- upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie.
- 4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v priebehu vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady.
- 4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.
- 4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu.
- 4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu Objednávateľom na vykonanie Diela.
- 4.14 Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania a to úradne overenou kópiou uvedeného dokumentu. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo (vrátane DPH) a poistenie musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela.
- 4.15 Zhotoviteľ je ďalej povinný preukázať Objednávateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diela a to úradne overenou kópiou uvedeného dokumentu. Toto poistenie sa musí vzťahovať na relevantnú realizovanú stavbu, a to po celú dobu vykonávania Diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo (vrátane DPH).
- 4.16 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný pre realizáciu podkladových vrstiev vypracovať dokumentáciu vykonania prác (DVP) na presnú lokalizáciu, ktorú je povinný predložiť Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa na schválenie. Všetky podkladové vrstvy je možné realizovať až po odsúhlasení Objednávateľom a jeho stavebným dozorom.
- 4.19 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP), technologické postupy (TP) a kontrolno-skúšobný plán (KsP) budú predložené dozoru Objednávateľa pred začatím realizácie stavby. Realizácia prác môže byť zahájená až po schválení DVP, TP a KsP zo strany Objednávateľa.
- 4.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí vyhotovením Preberacieho protokolu.
- 4.21 Objednávateľ vyžaduje od Zhotoviteľa vedenie stavebného denníka elektronickou formou pomocou špeciálneho softvéru/aplikácie. Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas realizácie diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Nevyhnutnou súčasťou denných zápisov v stavebnom denníku je aj fotodokumentácia prác realizovaných v príslušnom dni. Pri ukončení projektu/Diela sa vyžaduje odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka ako v papierovej forme (1x), tak aj vo forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči). Predložená elektronická forma a papierové vyhotovenie stavebného denníka musí byť identická.

- 4.22 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy.
- 4.23 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť na vyzvanie vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a príslušným štátnym orgánom.
- 4.24 Zápisy do stavebného denníka zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 4.25 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 4.26 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiadava, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
- 4.27 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.
- 4.28 Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
- 4.29 Realizáciu kladenia živичných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev je povinný vykonať výlučne priamo Zhotoviteľ.
- 4.30 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho protokolu.
- 4.31 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
- 4.32 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 4.33 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výroby. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výroby, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe akreditovaného skúšobného laboratória do výroby výrobcu za účelom odobratia vzoriek asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v

príslušných rezortných predpisoch (TP, TKP, VL a KL) a ďalej súvisiacich STN a STN EN, platných v čase realizácie Diela;

- 4.34 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela (dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu zmluvy, projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN a STN EN platných v čase realizácie Diela). Odvrty (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.
- 4.35 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Zmluvných strán.
- 4.36 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele a kvality Diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Objednávateľ bude považovať Dielo za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.
- 4.37 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela alebo väd Diela bude zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto skúšky.
- 4.38 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
- 4.39 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 4.40 Zhotoviteľ má povinnosť všetky dodané cestné smerové stĺpiky označiť pomocou raznice logom Objednávateľa. Táto raznica bude Zhotoviteľovi zapožičaná na základe protokolu o zapožičaní na nevyhnutne potrebný čas po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Vrátenie raznice bude rovnako na základe protokolu o vrátení.
- 4.41 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela.
- 4.42 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch.
- 4.43 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcii či údržbe Diela a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov a vybúraných materiálov mobilným zariadením na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k Zákona o odpadoch v časti VI. bod 2., je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.
- 4.44 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebitelný a

stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so Zákonom o odpadoch.

- 4.45 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a spracovania odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení Preberacieho protokolu, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento odpad vznikol a v takom prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list nebezpečného odpadu časť 1 a časť 4. K odpadom, ktoré boli zhodnotené mobilným zariadením pod kódom R5 je Zhotoviteľ povinný predložiť vyhlásenie o parametroch v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- 4.46 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarom a legálnosť pracovnoprávných vzťahov a ich kontrolu v zmysle osobitných predpisov.
- 4.47 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko.
- 4.48 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na:
- (a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;
 - (b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;
 - (c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;
 - (d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov;
 - (e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;
 - (f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;
 - (g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov;
 - (h) prispôbovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu stavebných prác;
 - (i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi;
 - (j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti; a
 - (k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom.
- 4.49 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na stavenisku, požiaru, havárie a pod.

- 4.50 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti.
- 4.51 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom vypracuje záznam o kontrole na stavenisku.
- 4.52 Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku.
- 4.53 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činnosti pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.
- 4.54 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním väd Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 4.55 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, znáša Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu.

5 SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

- 5.1 Zhotoviteľ môže na splnenie Zmluvy využiť Subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej Zmluvy len jednému Subdodávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri vykonávaní Diela spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 ZVO a s pravidlami pre zmenu Subdodávateľa uvedenými v tomto článku Zmluvy.
- 5.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia Zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní Diela, je povinný pri podpise Zmluvy písomne uviesť v Prílohe 3 Zmluvy údaje o Subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia Zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha 3 Zmluvy je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 5.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho Subdodávateľov, ak sa preukáže, že Subdodávateľ postupuje tak, že sa Dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami Zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť Subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi, a to do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene.
- 5.6 K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upraveným v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnástich) Pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena Subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny Subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového Subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v

rozsahu ako sú údaje uvedené v bode 5.3 Zmluvy (aktualizovaný zoznam Subdodávateľov). Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia aktualizovanej Prílohy 3 Zmluvy, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. V tom prípade Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového Subdodávateľa do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

- 5.7 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho Subdodávateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a Subdodávateľa podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak Subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
- 5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do Registra partnerov verejného sektora.
- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením Zmluvy alebo kým Zhotoviteľ nespĺní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

6 ODOVZDANIE DIELA

- 6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ 4 (štyri) Pracovné dni pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatíu Diela. Najneskôr 2 (dva) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho – preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 6.3 Pre odovzdanie Diela platí:
- (a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek Zmluvy a jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní Diela, použije sa postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa;
 - (b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a
 - (c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávanom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v digitálnej forme (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) a v papierovej forme v 2 (dvoch) vyhotoveniach:
- (a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby – Diela (DSRS) so zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných

prác vrátane konštrukčných detailov;

- (b) porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela;
- (c) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na dátovom nosiči;
- (d) zápisnice o preverení prác a konštrukcii v priebehu zakrytých prác;
- (e) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
- (f) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;
- (g) schválené Technologické postupy;
- (h) stavebný denník v tlačenej (papierovej) forme v 1 (jednom) vyhotovení;
- (i) rekapituláciu výmer;
- (j) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP);
- (k) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov;
- (l) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov;
- (m) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na nakladanie s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, prípadne iné súhlasy alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom); a
- (n) vyhlásenie o parametroch k recyklovanému odpadu spracovanému pod kódom R3 / alebo R5 v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia-Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií;

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že Dielo má vady.

- 6.5 Na odovzdávanom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami, inak je Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť kópie alebo skeny všetkých Evidenčných listov odpadu Zhotoviteľa (každej kategórie odpadu) stavby, a to do 2 mesiacov odo dňa podpísania Preberacieho protokolu diela, najneskôr však do 31.01. roka nasledujúceho po odovzdaní diela. Porušenie tejto povinnosti bude sankcionované v zmysle bodu 11 tejto Zmluvy.

7 ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami:
 - (a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku; alebo

- (b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu :

ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

- 7.2 Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do uplynutia záručnej doby, pričom do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku zo zodpovednosti za vady Diela až do odstránenia príslušnej vady Diela.
- 7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku na záručné opravy do výšky Garančnej záruky.
- 7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 Zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy.

8 CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v úvode Zmluvy a stanovená na základe ponukového rozpočtu vyjadreného v Zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby – Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.
- 8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:
- (a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo
- (b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom;
- a to na základe písomného dodatku k Zmluve.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené Objednávateľom.
- 8.4 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie Ceny za Dielo dňom podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju Objednávateľovi na e-mailovú adresu ekonomicke@spravaciest.sk najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Objednávateľom.
- 8.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým je Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí byť Preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 8.6 Cena za Dielo je splatná **do 30 (tridsiatich) dní** odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň splatnosti Ceny za Dielo prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň.
- 8.7 Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo

z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

- 8.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním dokumentov uvedených v čl. 6 ods. 6.4 tejto Zmluvy

9 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým normám, a že bude bez väd, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklý účel.
- 9.2 Záručná doba je **60 (šesťdesiat) mesiacov** a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia väd Diela. Odobratie vzoriek (odvrtý) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie záruky.
- 9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela.
- 9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z väd Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním väd Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie väd Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatichpiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie väd Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom.

10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

- 10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom:
- (a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené;
 - (b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu;
 - (c) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na riadne plnenie Zmluvy;
 - (d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto povinnosť vzťahuje;

- (e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; a
 - (f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.52 Zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za vlastnosti, ktoré si vymienil.
- 10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy nebolo v čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcim po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia.
- 10.4 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom:
- (a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy;
 - (b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a
 - (c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre jeho zánik a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.
- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.
- ## 11 SANKCIE
- 11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť:
- (a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác podľa bodu 4.1 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (päť desiatin percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania;
 - (b) byť poistený podľa bodu 4.14 a 4.15 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;
 - (c) prevziať stavenisko podľa bodu 4.2 Zmluvy alebo vypratať stavenisko podľa bodu 6.6 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania;
 - (d) kompletne realizovať všetky asfaltové vrstvy výlučne priamo sám podľa bodu 4.29 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;
 - (e) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj

opakovane; alebo

- (f) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.

11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplatenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

11.4 Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu prípadných preukázateľných sankcií, ktoré mu boli uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.

11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.

11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.

12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to **do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.**

12.2 Zmluva môže byť zrušená:

- (a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise alebo dohodnutých v Zmluve; alebo
- (b) písomnou dohodou Zmluvných strán.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ:

- (a) neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 Zmluvy;
- (b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramu prác v zmysle bodu 4.1 Zmluvy;
- (c) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy;
- (d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 a 4.15 Zmluvy;
- (e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou dokumentáciou, s osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;
- (f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác;
- (g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu,

- (h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo požiadavkám uvedeným v Zmluve;
 - (i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO a/alebo podľa článku 5 Zmluvy;
 - (j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy;
 - (k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcim po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným;
 - (l) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo
 - (m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Zmluvy.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO;
- 12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa bodu 10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné.
- 12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi.
- 12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
- ### 13 KOMUNIKÁCIA
- 13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so Zmluvou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.
- 13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené:
- (a) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
 - (b) 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo
 - (c) v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
- 13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy došlo k tejto zmene.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.
- 14.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.
- 14.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.
- 14.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami.
- 14.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.
- 14.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živeľnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a preukázať a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.
- 14.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.
- 14.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch.

Prílohy Zmluvy:

Príloha 1	Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet
Príloha 2	Harmonogram prác
Príloha 3	Zoznam Subdodávateľov
Príloha 4	Zmenový list

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ:

V Trnave dňa 12. 08. 2026

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

v.r.

Meno: Ing. Dalibor Trebichalský
Funkcia: riaditeľ

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 17. 07. 2026

Doprastav, a.s.

v.r.

Meno: Ing. František Očkaják
Funkcia: riaditeľ závodů Bratislava

v.r.

Meno: Ing. Peter Farko
Funkcia: zástupca riaditeľa závodu Bratislava

PRÍLOHA 1

ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET

Predmetom Diela je realizácia stavebných prác na ceste III/1356 v úseku od križovatky s miestnou/účelovou cestou k štrkovisku Šoriakoš po hranicu predchádzajúcej rekonštrukcie v kkm 10,160 - 10,780 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky. Nevyhnutnou súčasťou Diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Podrobný opis:

Riešený úsek sa nachádza na ceste III/1356 v kkm 10,160 - 10,780 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Začiatok úseku je od križovatky s miestnou/účelovou cestou k štrkovisku Šoriakoš a koniec je na hranici predchádzajúcej rekonštrukcie, nachádza sa v extraviláne, tvorí súvislú trasu a je v celkovej dĺžke 620 m.

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. V prípade, ak predmetná rekonštrukcia nebude zrealizovaná a pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia, dôjde k ďalšej degradácii krytu. Následkom bude negatívny vplyv na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou z dopravy.

V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Zhotoviteľ zabezpečí vytyčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí, vrátane tých, ktoré nie sú v dokumentácii zakreslené. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu sietí. Siete ostanú v pôvodnej polohe bez zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené a zabezpečené v zmysle podmienok vlastníkov/správcov.

Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované v rámci cestného telesa, kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty III/1356 bez zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na príľahlé pozemky. Všetky betónové plochy ostanú zachované. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvorenie pružného spoja – asfaltová zálievka.

Rekonštrukcia je navrhnutá s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky a ponechaním pôvodného podlažia. Vzhľadom na rozdielny stav konštrukčných vrstiev a miestne podmienky je úsek členený na :

- úseky s výmenou asfaltových vrstiev (obrusná + ložná),
- úseky s rekonštrukciou výkopom alebo studenou recykláciou podkladových vrstiev.

V celom úseku rekonštrukcie budú vyčistené všetky priepusty od nánosov. Betónové časti priepustov budú sanované a opravené; na čelách priepustov v intraviláne bude osadené zábradlie mestského typu. Sanácia bude realizovaná prostredníctvom certifikovaného a riadne schváleného výrobku.

Vybúrané materiály budú odvezené na vhodné zariadenie (miesto) určené na ich zhodnotenie, dočasné uloženie alebo zneškodnenie v súlade s platnými predpismi. Uvažovaná priemerná dopravná vzdialenosť od riešeného úseku je 20 km.

Pokládka asfaltových zmesí musí byť vyhotovená v súlade so STN 73 6121. Pokládka bude realizovaná po aplikovaní postrekov podľa STN 73 6129.

Práce budú realizované za premávky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, s usmernením premávky dočasným dopravným značením. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položení asfaltovej vrstvy uvoľnená až po jej riadnom dohutnutí a vychladnutí na teplotu najviac 40 °C. Po položení postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať po vyštípení emulzie a odparení vody.

Predpokladá sa odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následné polozenie 70 mm ložnej a 50 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa uvažuje aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD) a/alebo odstránením konštrukčných vrstiev vozovky v hrúbke min. 400 mm podľa skutočného stavu. Jednotlivé konštrukčné typy sú popísané v priloženej projektovej dokumentácii (technickej správe a príslušných výkresoch).

Napojenie na začiatku a konci rekonštruovaného úseku bude preplátovaním asfaltových vrstiev. Všetky výmeny podkladných vrstiev sa budú realizovať po odsúhlasení projektanta a technického dozora investora. Pre realizáciu výmen podkladných vrstiev bude spracovaný stupeň projektovej dokumentácie na vykonanie prác DVP na presnú lokalizáciu.

Ďalej sa predpokladá oprava krajníc, vyčistenie a prehĺbenie priekop, na trase rekonštrukcie.

Všetky cestné stĺpiky budú vymenené za nové, opatrené odrazkami/plašičmi zveri a budú doplnené výsuvnou snehovou tyčou. Na všetkých dodaných smerových stĺpikoch bude raznicou vyznačený správca. Raznica bude zhotoviteľovi zapožičaná po účinnosti zmluvy

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru investora pred začatím realizácie stavby.

Objednávateľ vyžaduje vedenie stavebného denníka elektronickou formou.

Súčasťou dodania bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia (DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom.

Projekt dočasného dopravného značenia a vydanie určenia na tento projekt nie je predmetom priloženej dokumentácie; boli vypracované len orientačné schémy práce na ceste podľa príslušných TP.

Opätovná realizácia vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená vlastnými silami/pracovníkmi Objednávateľa (SÚC TTSK).

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.: odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z. v časti 6 odstavec 2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.

Objednávateľ dáva do pozornosti požiadavku a znenie projektovej dokumentácie, časť Technickej správy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov: „Správca komunikácie požaduje v rámci odovzdávacieho konania predložiť k recyklovanému odpadu (recyklátu) použitému do konštrukčných vrstiev vozovky doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, najmä vyhlásenie o parametroch pre výstup zo zhodnocovania odpadu (R3 alebo R5, podľa použitej technológie a druhu odpadu), a to v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Bez predloženia uvedených dokladov nebude možné predmetné vrstvy považovať za riadne preukázané v rámci odovzdania diela.“

Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú:

- predchádzanie vzniku odpadov,
- materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
- environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.

Predchádzať vzniku odpadov je možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov od vytiaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä počas výstavby.

Pred odovzdaním Diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS).

Odovzdanie zrealizovaného Diela, vrátane ucelenej odovzdávacej dokumentácie v zmysle Zmluvy sa vyžaduje najneskôr do 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia stavebných prác, ktorý je uvedený v stavebnom denníku.

Všetka odovzdávacia dokumentácia musí byť predložená v papierovej forme, v elektronickej forme editovateľnej aj needitovateľnej na zodpovedajúcom nosiči v 2 vyhotoveniach tak, ako uvádza Zmluva.

Pred odovzdaním Diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS).

Všetka odovzdávacia dokumentácia musí byť predložená v papierovej forme, v elektronickej forme editovateľnej aj needitovateľnej na zodpovedajúcom nosiči v 2 vyhotoveniach tak, ako uvádza Zmluva.

Termíny realizácie:

Prevzatie staveniska – do 5 pracovných dní od výzvy verejného obstarávateľa, najneskôr do 8 týždňov od účinnosti Zmluvy.

Doba realizácie: vid'. Príloha 2 Zmluvy (Harmonogram prác)

Odobzdanie zrealizovaného Diela vrátane ucelenej odovzdávacej dokumentácie v zmysle Zmluvy sa vyžaduje najneskôr do 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia stavebných prác, ktorý je uvedený v stavebnom denníku.

Výkonnostná zábezpeka: 20 % z ceny Diela s DPH

Osoby určené pre komunikáciu:

Na strane Objednávateľa:

Ing. Monika Zatková, monika.zatkova@spravaciest.sk,

Veronika Blažeková, veronika.blazekova@spravaciest.sk,

Mgr. Jozef Šmida, jozef.smida@spravaciest.sk,

PhDr. Pavel Racsko, pavel.racsko@spravaciest.sk,

Technický dozor: Ing. Marián Kabina,

Stavebný dozor: Ing. Martin Hajdóny,

Na strane Zhotoviteľa:

Ing. Peter Majerík

Kontakt: ; peter.majerik@doprastav.sk

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C0092
Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

JKSO:
Miesto: Trnavský samosprávny kraj

ČS:
Dátum: 28.3.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK2020372497

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			183 514,85
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	183 514,85	42 208,42
Cena s DPH v EUR			225 723,27

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	C0092		
Stavba:	Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš		
Miesto:	Trnavský samosprávny kraj	Dátum:	28.03.2026
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Doprastav, a.s.	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		183 514,85	225 723,27
C0092	Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš	183 514,85	225 723,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

Objekt:

C0092 - Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

JKSO:

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 28.03.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31 333 320

IČ DPH:

SK2020372497

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

183 514,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	183 514,85	23,00%	42 208,42

Cena s DPH

v EUR

225 723,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

Objekt:

C0092 - Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

Dátum: 28.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

183 514,85

HSV - Práce a dodávky HSV

177 264,85

1.1 - Zemné práce - Búracie práce

8 239,13

5 - Komunikácie

165 353,05

5.1 - Komunikácie - zlepšenie podložia

228,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 464,25

99 - Presun hmôt HSV

979,62

OST - Ostatné

1 150,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

5 100,00

VRN04 - Projektové práce

5 000,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

Objekt:

C0092 - Rekonštrukcia cesty III/1356 - úsek Čierna Voda – Šoriakoš

Miesto: Trnavský samosprávny kraj

Dátum: 28.03.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **183 514,85**

D HSV Práce a dodávky HSV 177 264,85

D 1.1 Zemné práce - Búracie práce 8 239,13

1	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	11 064,564	0,56	6 196,16
---	---	-------------	--	----	------------	------	----------

W frézovanie
W 4610,235*2,4
W Súčet 11 064,564
11 064,564

2	K	113307225.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500mm, - 0,72000t	m2	1 634,375	1,25	2 042,97
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

D 5 Komunikácie 165 353,05

3	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 634,375	3,55	5 802,03
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

4	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 634,375	7,25	11 849,22
---	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

5	K	572701111.S.1	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	616,000	2,25	1 386,00
---	---	---------------	---	----	---------	------	----------

P Poznámka k položke:
W Oprava krajnice
W oprava krajnice
W (630+580+22)*0,5 616,000

6	M	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm	t	1 170,400	3,25	3 803,80
---	---	----------------	----------------------------	---	-----------	------	----------

P Poznámka k položke:
W 1900kg/m3
W 616*1,9 'Prepočítané koeficientom množstva 1 170,400

7	K	573131103.S.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	4 610,235	0,65	2 996,65
---	---	---------------	---	----	-----------	------	----------

W 4610,235 4 610,235

8	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	5 762,794	0,51	2 939,02
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

W 4610,235+4610,235/4 5 762,794

9	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 610,235	11,95	55 092,31
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

10	K	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	5 762,794	13,65	78 662,14
----	---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

P Poznámka k položke:
W Vráťane vyrovnávky

11	K	912391111.S	Montáž odražača plašiča zveri na plastový smerový stĺpik	ks	40,000	3,50	140,00
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

12	M	404490001800.S	Odražač pre plašenie zveri	ks	40,000	14,30	572,00
----	---	----------------	----------------------------	----	--------	-------	--------

13	K	91593000	Osadenie smerového cestného stĺpika	ks	40,000	6,80	272,00
----	---	----------	-------------------------------------	----	--------	------	--------

14	M	404490000400.S	Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	40,000	24,20	968,00
----	---	----------------	---	----	--------	-------	--------

W cestných stĺpikov so snehovou tyčou
W 40 40,000
W Súčet 40,000

15	K	91972672R	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	659,000	1,32	869,88
----	---	-----------	---------------------------------	---	---------	------	--------

P Poznámka k položke:
W Zálievky pozdĺžnych a priečnych škár
W v strede vozovky+pozdĺž obrubníkov
W 620+7+7+25 659,000


D 5.1 Komunikácie - zlepšenie podlažia 228,80


16	K	131301102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	898,906	0,01	8,99
----	---	-------------	--	----	---------	------	------

VV		1634,375*0,55 'Prepočítané koeficientom množstva		898,906			
17	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	898,906	0,01	8,99
18	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	898,906	0,01	8,99
19	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15 281,402	0,01	152,81
VV		898,906*17 'Prepočítané koeficientom množstva		15 281,402			
20	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	1 634,375	0,01	16,34
21	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 634,375	0,01	16,34
22	K	564851112.X	Podklad zo štrkodrviny 63-125 (150) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 634,375	0,01	16,34
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 464,25	
23	K	938909422.S	Čistenie / zhotovenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	1 232,000	0,75	924,00
VV		1232		1 232,000			
24	K	938909612.S	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr. nad 100 do 200 mm, -0,25200t	m2	616,000	0,15	92,40
VV		1232*0,5		616,000			
25	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	2 954,800	0,15	443,22
P		Poznámka k položke: Vrátane poplatkov za skládku					
VV		Bitumen					
VV		1383,071		1 383,071			
VV		Cistenie priekop					
VV		239,747		239,747			
VV		Odstránenie nánosu					
VV		155,232		155,232			
VV		Podkladné vrstvy					
VV		1176,75		1 176,750			
VV		Súčet		2 954,800			
26	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	50 231,600	0,02	1 004,63
VV		2954,8*17 'Prepočítané koeficientom množstva		50 231,600			
D		99		Presun hmôt HSV		979,62	
27	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	6 530,808	0,15	979,62
D		OST		Ostatné		1 150,00	
28	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
D		VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		5 100,00	
29	K	001400051.S	Ostatné náklady stavby - náklady na softvérové služby pre digitalizáciu stavby	kpl	1,000	100,00	100,00
P		Poznámka k položke: elektronický stavebný denník					
D		VRN04		Projektové práce		5 000,00	
30	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). Náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP)	ks	1,000	1 550,00	1 550,00
P		Poznámka k položke: Pre účely ocenenia min. 4% ceny diela					
31	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
P		Poznámka k položke: Pre účely ocenenia min.2% ceny diela					
32	K	002	Geodetické zameranie počas výstavby a porealizačné zameranie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	002.1	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	500,00	500,00
34	K	003	Prevádzka staveniska	kpl	1,000	100,00	100,00
P		Poznámka k položke: Prevádzka staveniska pre potreby realizácie komunikácie					
35	K	005	Odstránenie staveniska	kpl	1,000	100,00	100,00
36	K	006	Zriadenie staveniska	kpl	1,000	100,00	100,00
37	K	009	Skúška únosnosti zemnej pláne	kpl	1,000	150,00	150,00
P		Poznámka k položke: Orientačná položka					

PRÍLOHA 2

HARMONOGRAM PRÁC

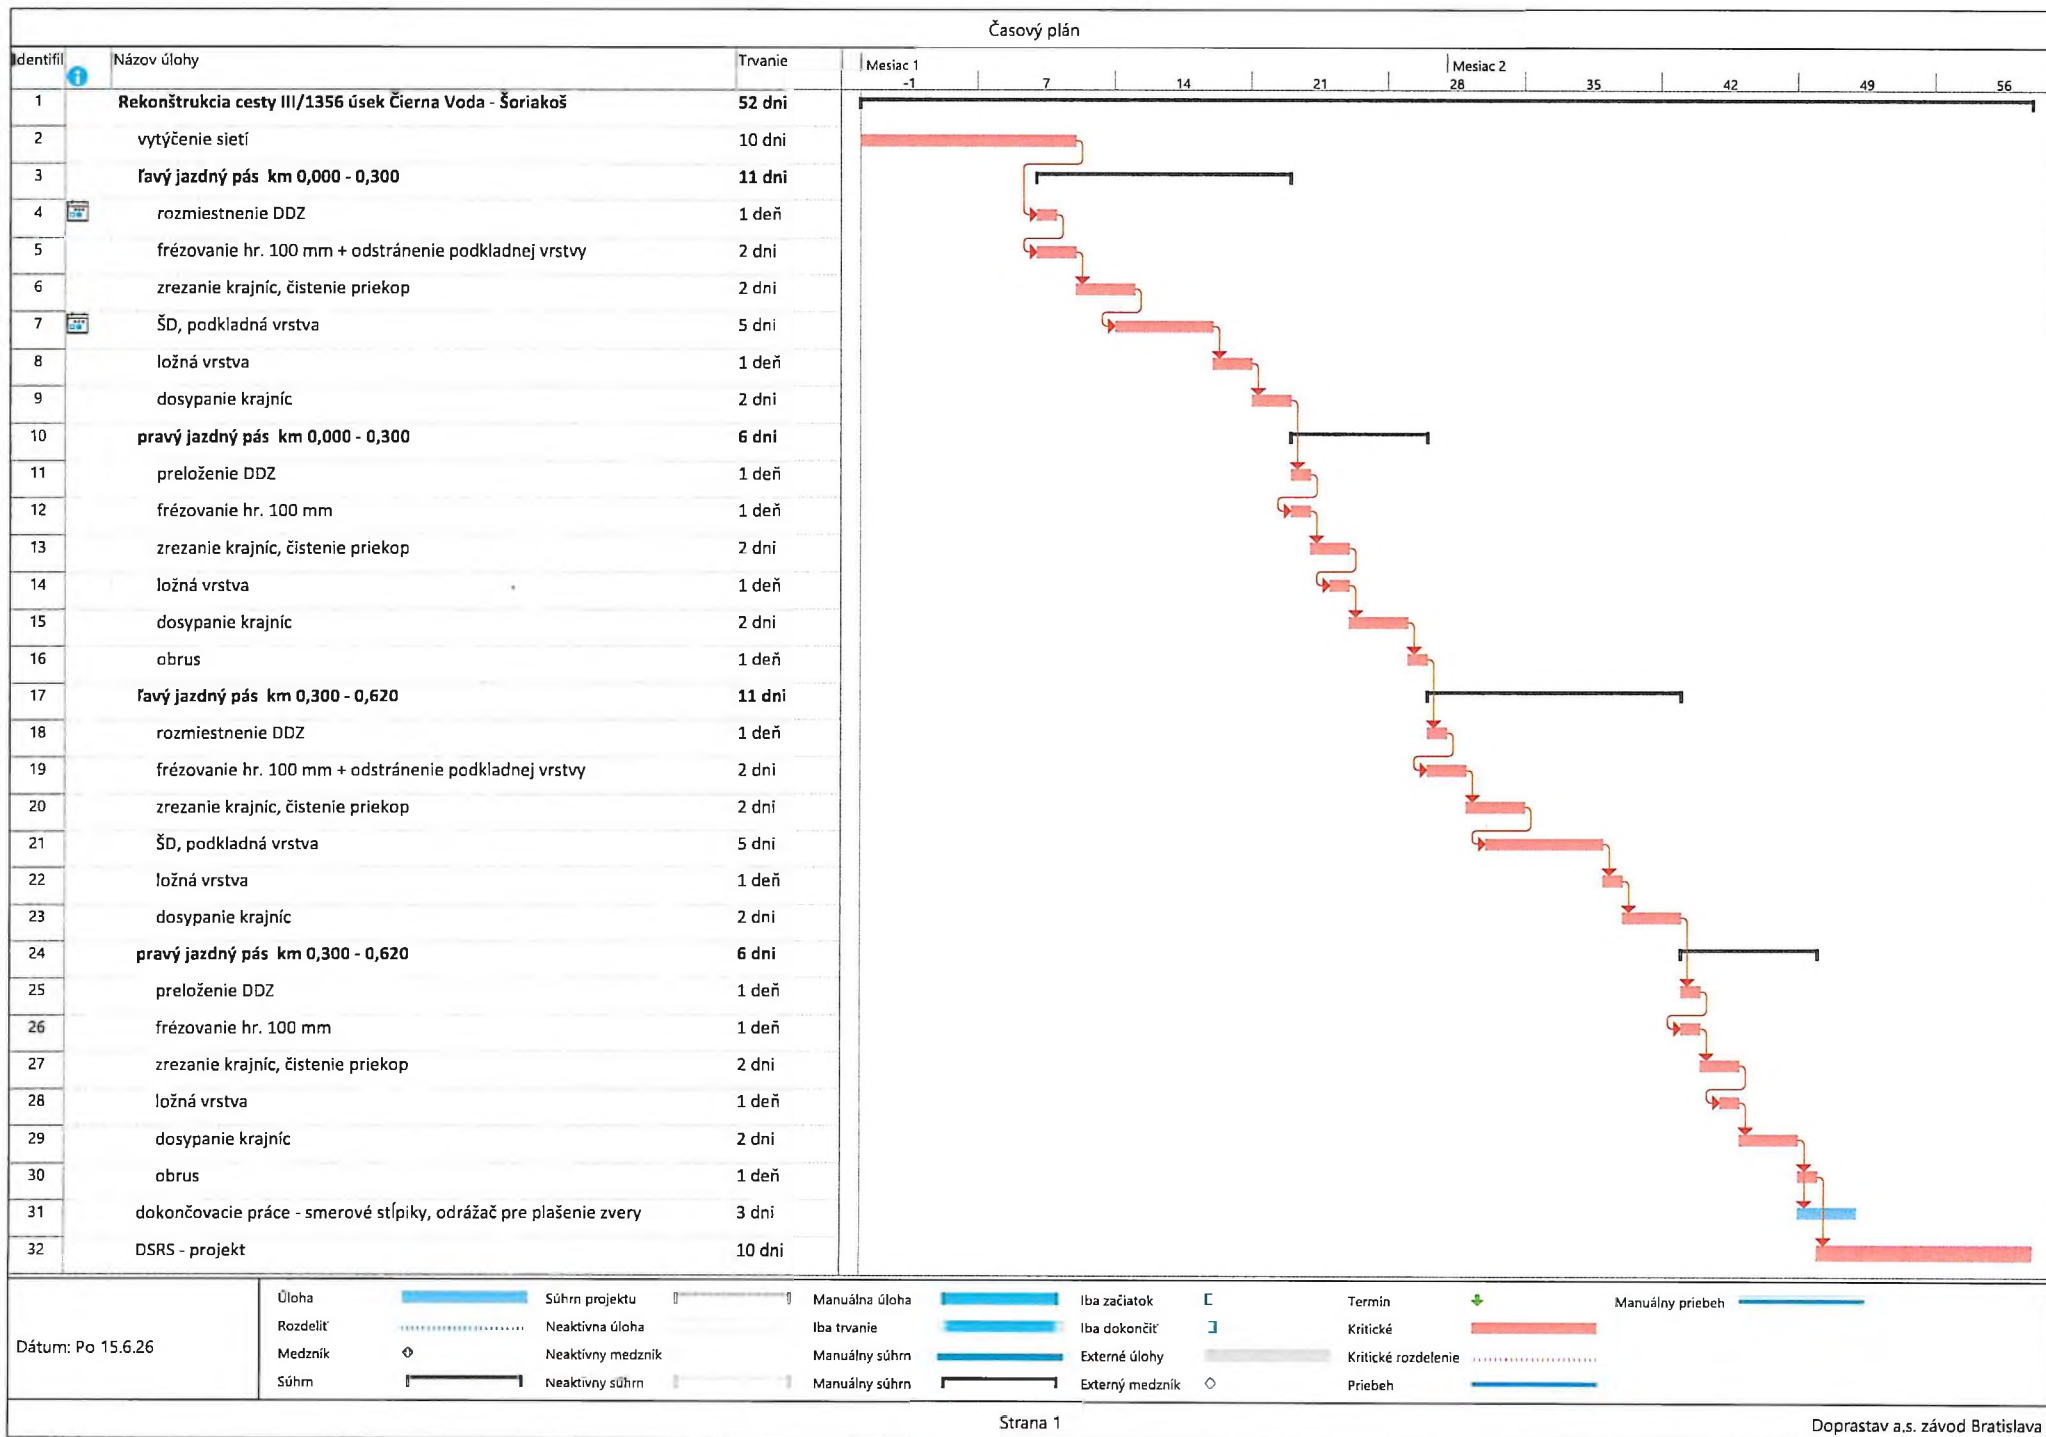

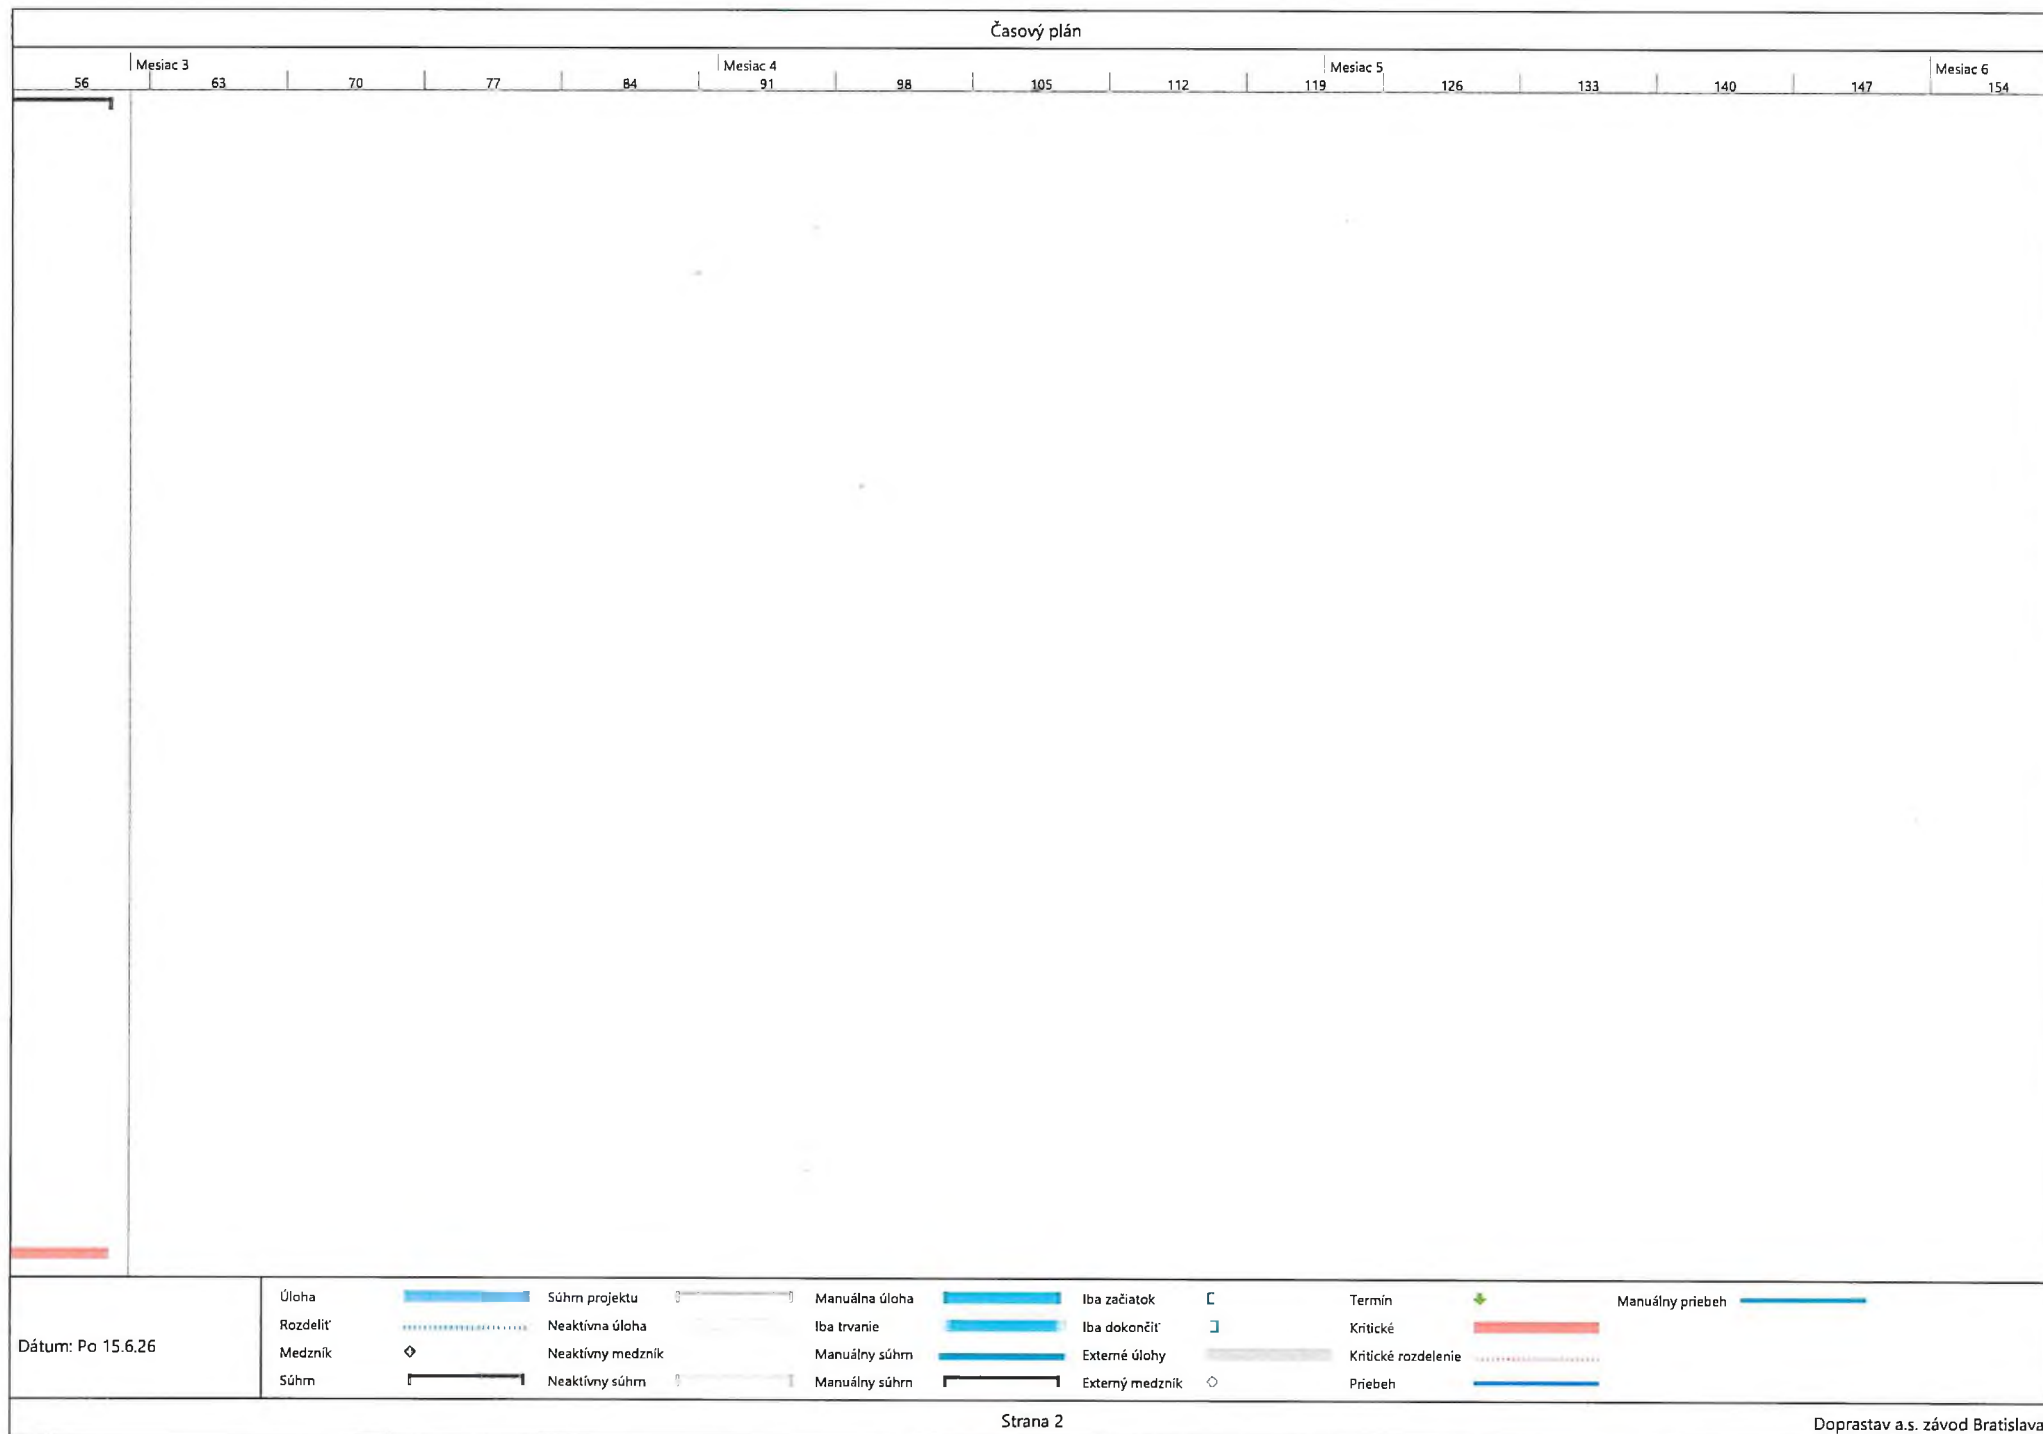

PRÍLOHA 3

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

P.č.	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konat' za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel na zákazke (%)
1.	VIA FLEX, s.r.o. Nádražná 33, 909 01 Skalica	44 259 867	Andrea Lovecká Konateľ Nar.	Modifikovaná asfaltová zálievka	0,47 %
2.					
3.					
4.					
5.					

PRÍLOHA 4

ZMENOVÝ LIST

Stavba
Stavebný objekt
Číslo ZoD

Zmenový list č.: xx

Stavba:

Číslo ZoD:

Poradové číslo zmenového listu:

XX

Zmena:

D - dokumentácia	
P - príprava	
R - realizácia	X

Stavebný objekt:

Názov zmeny:

Popis zmeny:

Zdôvodnenie zmeny:

Posúdenie zmeny - autorský dozor

Posúdenie zmeny - techn. dozor objednávateľa

Stavba _____
Stavebný objekt _____
Číslo ZoD _____

Zmenový list č.: xx

Dopady na:	Dielo/PD:	áno/nie	
	Harmonogram prác:	áno/nie	
	Cenu za Dielo:	áno/nie	Zvýšenie o
			bez DPH
			0,00 € s DPH
	Zníženie o:		0,00 € bez DPH
			0,00 € s DPH

Zdroj financovania zmeny:

Navrhovateľ zmeny:

Podpis:

Vyjadrenie Zhotoviteľa:

Podpis:

Vyjadrenie autorského dozoru/dohľadu

Podpis:

Vyjadrenie Objednávateľa:

Podpis:

Doporučenie

Podpis:

Záverečné stanovisko

Podpis:

Dátum:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Za autorský dozor/dohľad:

Zmenový list č.: xx

[illegible]

0,00

Stavba _____
Stavebný objekt _____
Číslo ZsD _____

Zmenový list č.: xx

POZÁMKY:

.....

PRÍLOHY k ZL:

Príloha č.1: Fotodokumentácia
